

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

	Estado	Comentario
PORTALES		
VOLCAN		
V1	inactivo	parada de invierno, cese CNM
YESO		
V5	inactivo	cese CNM
TS entrada	inactivo	túnel terminado
TS salida	inactivo	túnel terminado
VA4	activo	
COLORADO		
VA2	activo	
VA1	activo	
VL8	inactivo	parada seguridad circular 2345
VL7	inactivo	parada seguridad circular 2345
VL5	activo	
VL4	activo	
VL2	activo	
L1	activo	
ACOPIOS DE MARINA	Estado	
VOLCAN		
SAM 1	inactivo	parada de invierno, cese CNM
YESO		
SAM 2	activo	
SAM 3	inactivo	por programación
SAM 4	activo	
COLORADO		
SAM 5	activo	
SAM 6	activo	
SAM 7	completo	
SAM 8	activo	
SAM 9	activo	
SAM 10	activo	
SAM 11	completo	

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

SAM 12	activo
SAM 13	activo
SAM 14	activo

CAMPAMENTOS

Camp Volcán (Camp 1)	activo	30% ocupación
Camp Yeso (Camp 2)	activo	90% ocupación
Camp Aucayes Alto (Camp 3)	en construcción	
Camp Aucayes Bajo (Camp 4)	activo	100% ocupación

INTALACIONES DE FAENA

COLORADO

VA-1	activo
VA-2	activo
VL-7	activo
VL-8	activo
VL-4	activo
VL-5	activo
VL-2	activo
L-1	activo
IF-5	activo
IF-3	activo
IF-6	activo
IF-7	activo

VOLCAN

BT La Engorda	inactivo	parada de invierno, cese CNM
BT Colina	inactivo	parada de invierno, cese CNM
BT Las Placas	inactivo	parada de invierno, cese CNM
BT Est. Morado	inactivo	parada de invierno, cese CNM
Desarenador Volcán	inactivo	parada de invierno, cese CNM
Planta de Hormigón Volcán	inactivo	parada de invierno, cese CNM
Planta de Infiltración V1	activo	Funcionamiento normal y continuo
Planta de RILes V1	inactivo	Detenida por inactividad de construcción túnel V1 y por reparaciones
PTAS Campamento 1	activo	Funcionamiento normal y continuo

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

PTAP Campamento 1 YESO	activo	Funcionamiento normal y continuo
Túnel V5	inactivo	Cese CNM
Túnel VA4	activo	
BT YESO	activa	ACTIVA
ADUCCIÓN YESO	activo	384 mt DE TUBERÍAS SOLDADAS DE 5.137 AL 16 DE AGOSTO 2017

	Estado	Comentario	Fotografía
PORTALES V1	inactivo	52 % de avance en relación a 4 Km totales programados para D&B.	
ACOPIOS DE MARINA SAM 1	Estado inactivo	Cese contractual con CNM y parada de invierno	

CAMPAMENTOS



Camp Volcán

activo

30% ocupación

INTALACIONES DE FAENA

Bocatoma La Engorda

Inactivo

Sin actividad de construcción desde 08-06-2017, por cese contractual con CNM y condición invernal. Avance de 83 % en OO.CC. Solo se ejecutan tareas de mantención y limpieza.



Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

Bocatoma Colina	Inactivo	Sin actividad de construcción desde 08-06-2017, por cese contractual con CNM y condición invernal. Avance de 12 % en OO.CC. Solo se ejecutan tareas de mantención y limpieza.
-----------------	----------	---



Bocatoma Las Placas	Inactivo	Sin actividad actividad de construcción desde 08-06-2017, por cese contractual con CNM y condición invernal. Avance de 74 % en Excavación. Solo se ejecutan actividades de mantención y limpieza.
---------------------	----------	---

Bocatoma El Morado	Inactivo	Sin actividad de construcción desde 08-06-2017, por cese contractual con CNM y condición invernal. 72 % en Excavación. Solo se ejecutan actividades de mantención y limpieza.
--------------------	----------	---

Desarenador	Inactivo	Sin actividad de construcción desde 08-06-2017, por cese contractual con CNM y condición invernal. Avance de 40 % en OO.CC
-------------	----------	--









Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

Planta de Hormigón	Inactivo	Sin actividad desde 08-06-2017, por cese contractual con CNM y condición invernal.
Planta de Infiltración V1	Operativa	Funcionamiento normal y continuo
Planta de RILes V1	No operativa	Detenida por inactividad de construcción al interior del túnel y por reparaciones
PTAS Campamento 1	Operativa	Funcionamiento normal y continuo
PTAP Campamento 1	Operativa	Funcionamiento normal y continuo








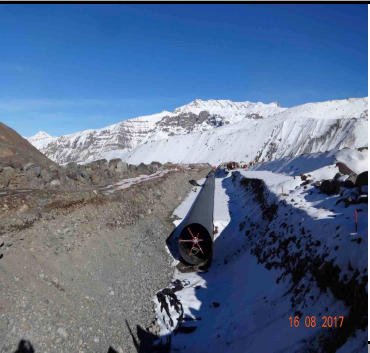
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

PORTALES	Estado	Comentario	Fotografía	
			INGRESO TÚNEL	ÁREA
V5	inactivo	1.090,5 mt CON RESPECTO A LOS 10,127 KM DE TÚNEL DESDE V5. DETENIDO DESDE EL 03 DE MAYO 2017, Cese CNM		
TS entrada	inactivo	TÚNEL TERMINADO 02 AGOSTO 2017 TOTAL TÚNEL SUELO 1.014,9 mT		
TS salida	inactivo	TÚNEL TERMINADO 02 AGOSTO 2017 TOTAL TÚNEL SUELO 1.014,9 mT		

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo



VA4	activo	1209,6 mt DE 6,250 KM HASTA LAS 7:00 hrs DEL 16 AGOSTO 2017	 SAIMI	 PANUKAMILLA
ACOPIOS DE MARINA	Estado			
SAM 2	activo	SE ENCUENTRA ACTIVO, PARCIALMENTE SE EXTRAE MATERIAL PARA CHANCADO DE ROCAS. VOLUMEN ACOPIADO 98978,42 M3 AL 16 AGOSTO 2017	 16 08 2017	 16 08 2017
SAM 3	inactivo	DETENIDO DESDE EL 03 DE MAYO 2017. VOLUMEN ACOPIADO 3424,02 M3 AL 16 DE AGOSTO 2017	 16 08 2017	 16 08 2017

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

SAM 4	ACTIVA	SE ENCUENTRA ACTIVO EN CUANTO A ACOPIO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. VOLUMEN ACOPIADO 126989,76 M3 AL 16 AGOSTO 2017		
BOCATOMAS				
BOCATOMA YESO	ACTIVA	ACTIVA		
ADUCCIÓN				
ADUCCIÓN YESO	ACTIVA	384 mt DE TUBERÍAS SOLDADAS DE 5.137 AL 16 DE AGOSTO 2017		
CAMPAMENTOS				

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo


CAMPAMENTO YESO	ACTIVO	ACTIVO		

PORTALES	Estado	Comentario	Fotografía
VA2	activo		
VA1	activo		

VL8

inactivo

parada seguridad
circular 2345

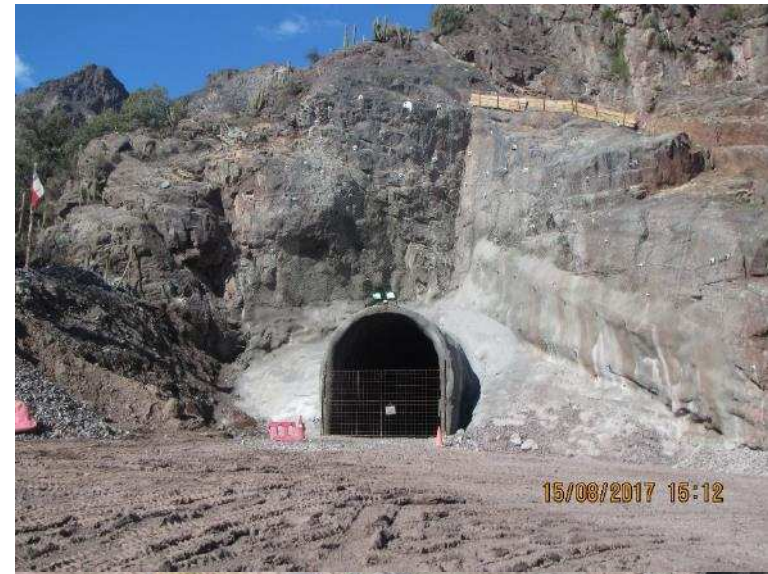

VL7

inactivo

parada seguridad
circular 2345



VL5

activo



VL4

activo



VL2

en construcción



L1

activo




ACOPIOS DE MARINA

Estado

SAM 5

activo

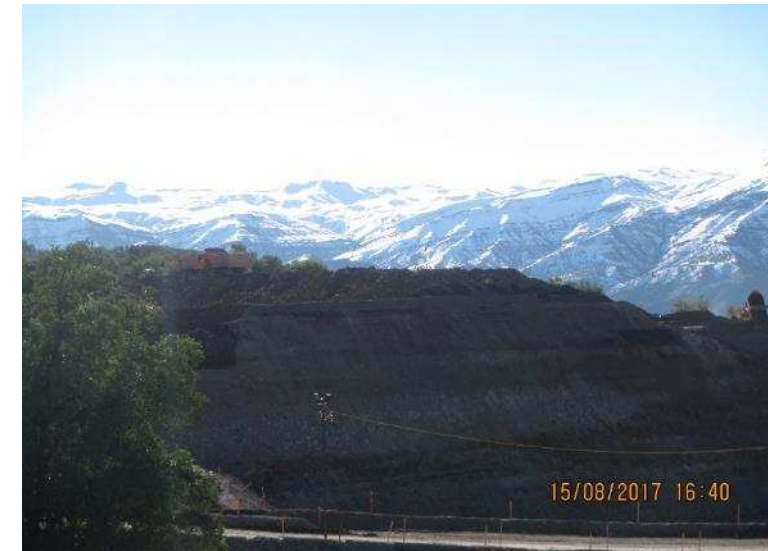

SAM 6

activo




SAM 7

completo



SAM 8

activo

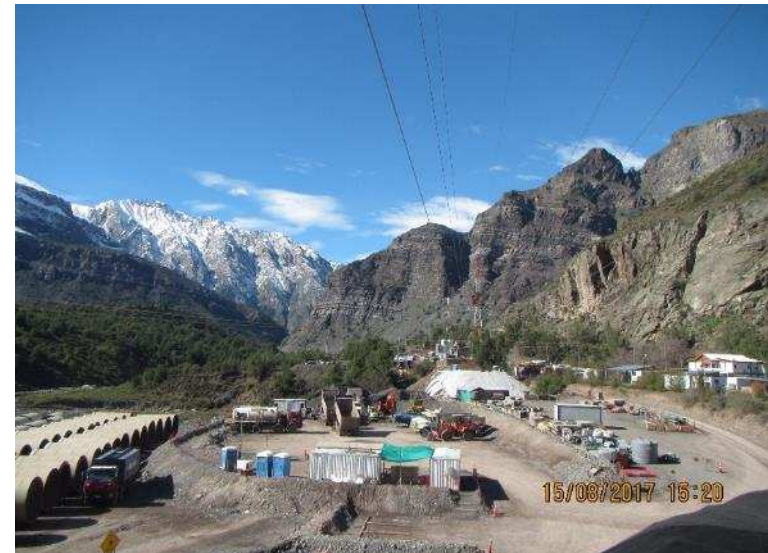

SAM 9

activo



SAM 10

activo



SAM 11

completo



SAM 12

activo




SAM 13

activo



SAM 14

activo

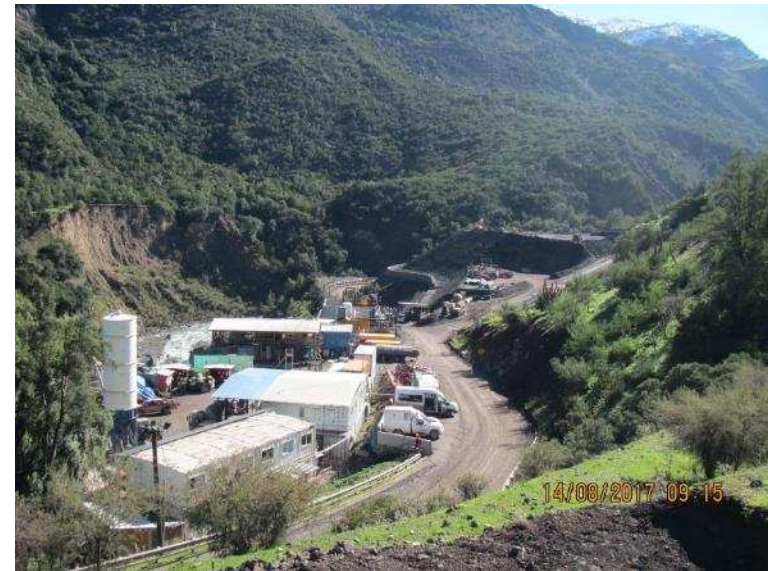

CAMPAMENTOS

Camp Aucayes Alto (Camp 3)

en construcción






Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

Camp Aucayes Bajo (Camp 4)

activo

100% ocupación

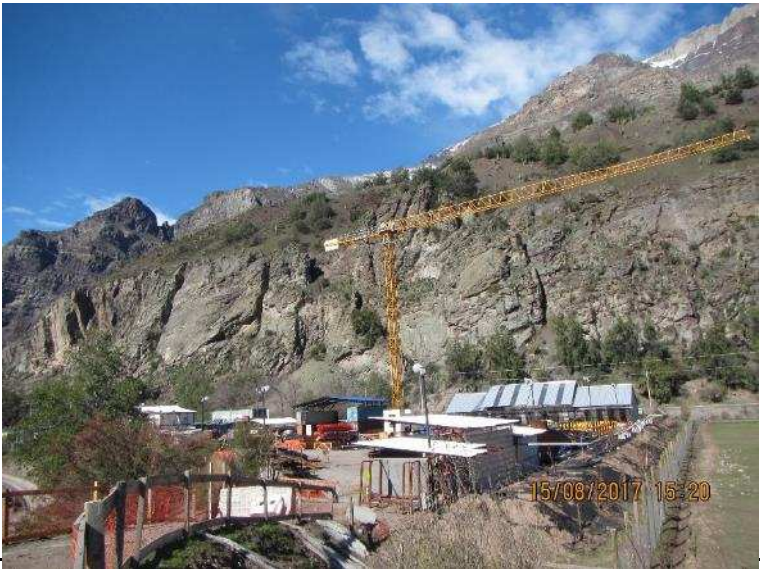

Frentes de Trabajo	
<p>VA-2</p>  <p>VL-8</p>	<p>VA-1</p>  <p>VL-7</p>
 <p>VL-4</p>	<p>Detenido por circular 2435</p> <p>VL-5</p>

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipio



L-1



Instalaciones de Faena y Campamento

Instalación de Faena 3 Aucayes Alto: Activa y Campamento 3: En Construcción




Instalación de Faenas 6: Activa



Instalación de Faenas 5. Activa

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

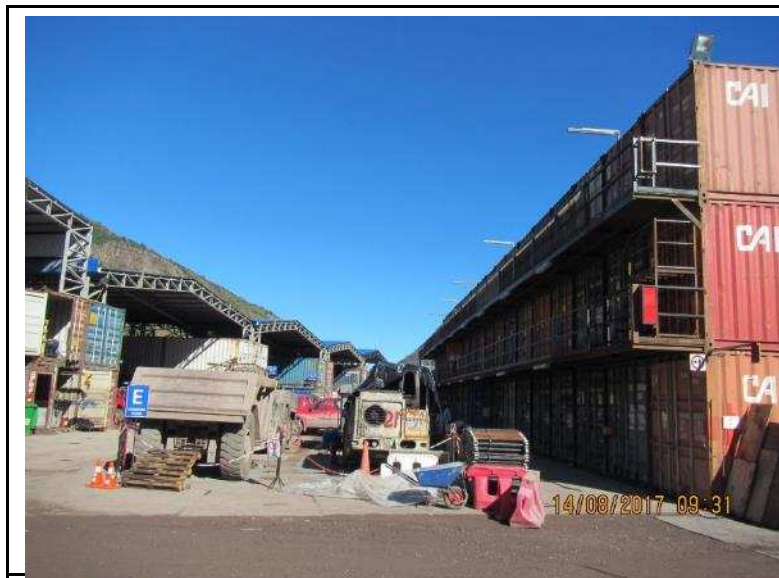

Instalacion de Faenas 7. Activa

