



---

Estado  
Programa de Cumplimiento  
RE N°3/ROL N° F-012-2015

---

Abril de 2020

**edelmag**  
GRUPO CGE

# Avances

## ➤ Construcción de equipamiento

- A la fecha se ha recibido en Punta Arenas el 100% del equipamiento a implementar en Central Tres Puentes. (Se adjuntan tres facturas del proveedor).
- Dada la contingencia de salud pública, la constructora ha sufrido atrasos por disminución de jornadas laborales, a modo de prevención de contagio, traducidas en dos semanas adicionales.

## ➤ Montaje de equipamiento

- Las obras presentan un avance de 90% (Se adjuntan cuatro facturas de la empresa constructora).
- Debido a la contingencia de salud pública y las medidas de cuarentena total en la ciudad de Punta Arenas, las obras de montaje han tenido impacto directo en su continuidad, viéndose disminuidas entre el 18 y el 31 de marzo e interrumpidas desde el 01 de abril de 2020 y hasta la fecha en que se levante la medida preventiva en la ciudad.



## ➤ Mediciones acústicas

- Se programará una segunda campaña de mediciones por parte del proveedor del equipamiento de insonorización una vez finalizadas las obras, para posteriormente realizar la validación con una ETFA.
- Para validación de ETFA se requiere la normalización de itinerarios de vuelo y condiciones sanitarias.

## ➤ Plazo adicional

- Una vez se levante la cuarentena en la ciudad, la empresa constructora requiere ocho (8) semanas para concluir las obras, mientras que para verificación acústica del proveedor del equipamiento y posterior validación de la ETFA para generar informe final se requieren cuatro (4) semanas adicionales.
- En total, se requieren 12 semanas, posterior a la normalización de actividades.

## Registro fotográfico

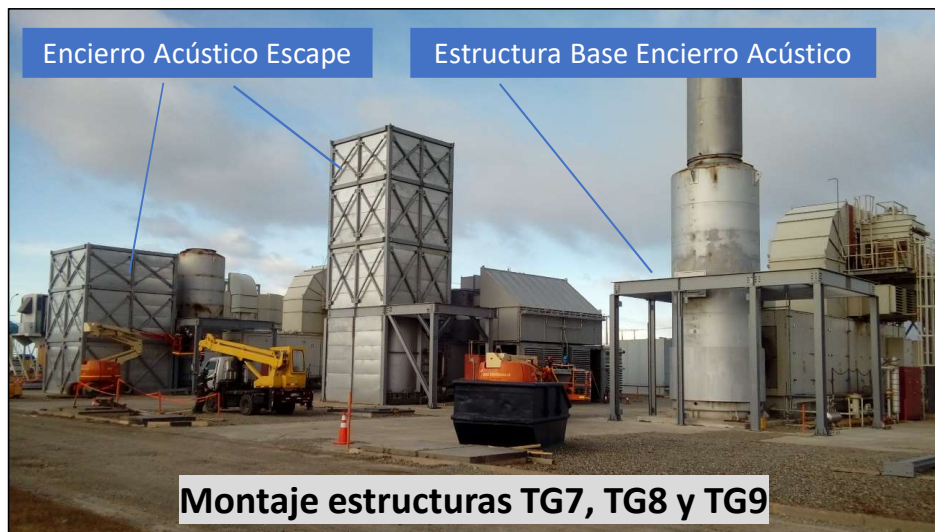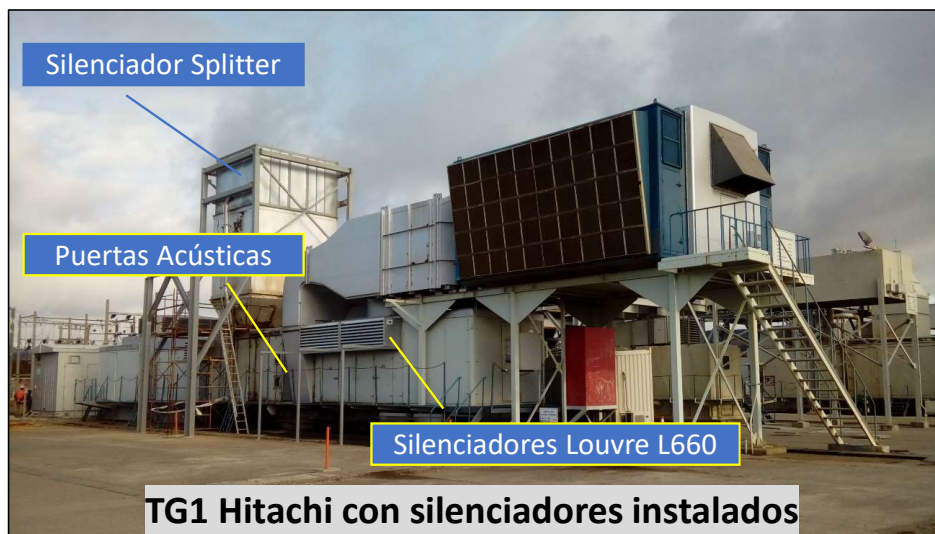




## Registro fotográfico



## Montos comprometidos

Descripción	Pagado al 12-12-19	Pagado Enero-Abril 2020	Pagado a la fecha	Montos futuros estimados	Monto total del proyecto
Provisión de Equipamiento	196.433.599	142.861.396	339.294.995	44.409.578	383.704.573
Montaje estructural de equipamiento acústico	83.820.269	59.450.465	143.270.734	19.937.238	163.207.972
Ingenierías	16.088.547	-	16.088.547	-	16.088.547
Adicionales Equipamiento	19.680.603	39.496.253	59.176.856	6.230.000	65.406.856
Adicionales Montaje	-	11.113.666	11.113.666	11.738.310	22.851.976
Otros (proveedores menores, HH propias, otras partidas)	56.972.697	28.754.378	85.727.075	72.355.445	158.082.520
<b>Total</b>	<b>372.995.715</b>	<b>281.676.158</b>	<b>654.671.873</b>	<b>154.670.571</b>	<b>809.342.444</b>

## Cronograma Ejecutivo del Proyecto

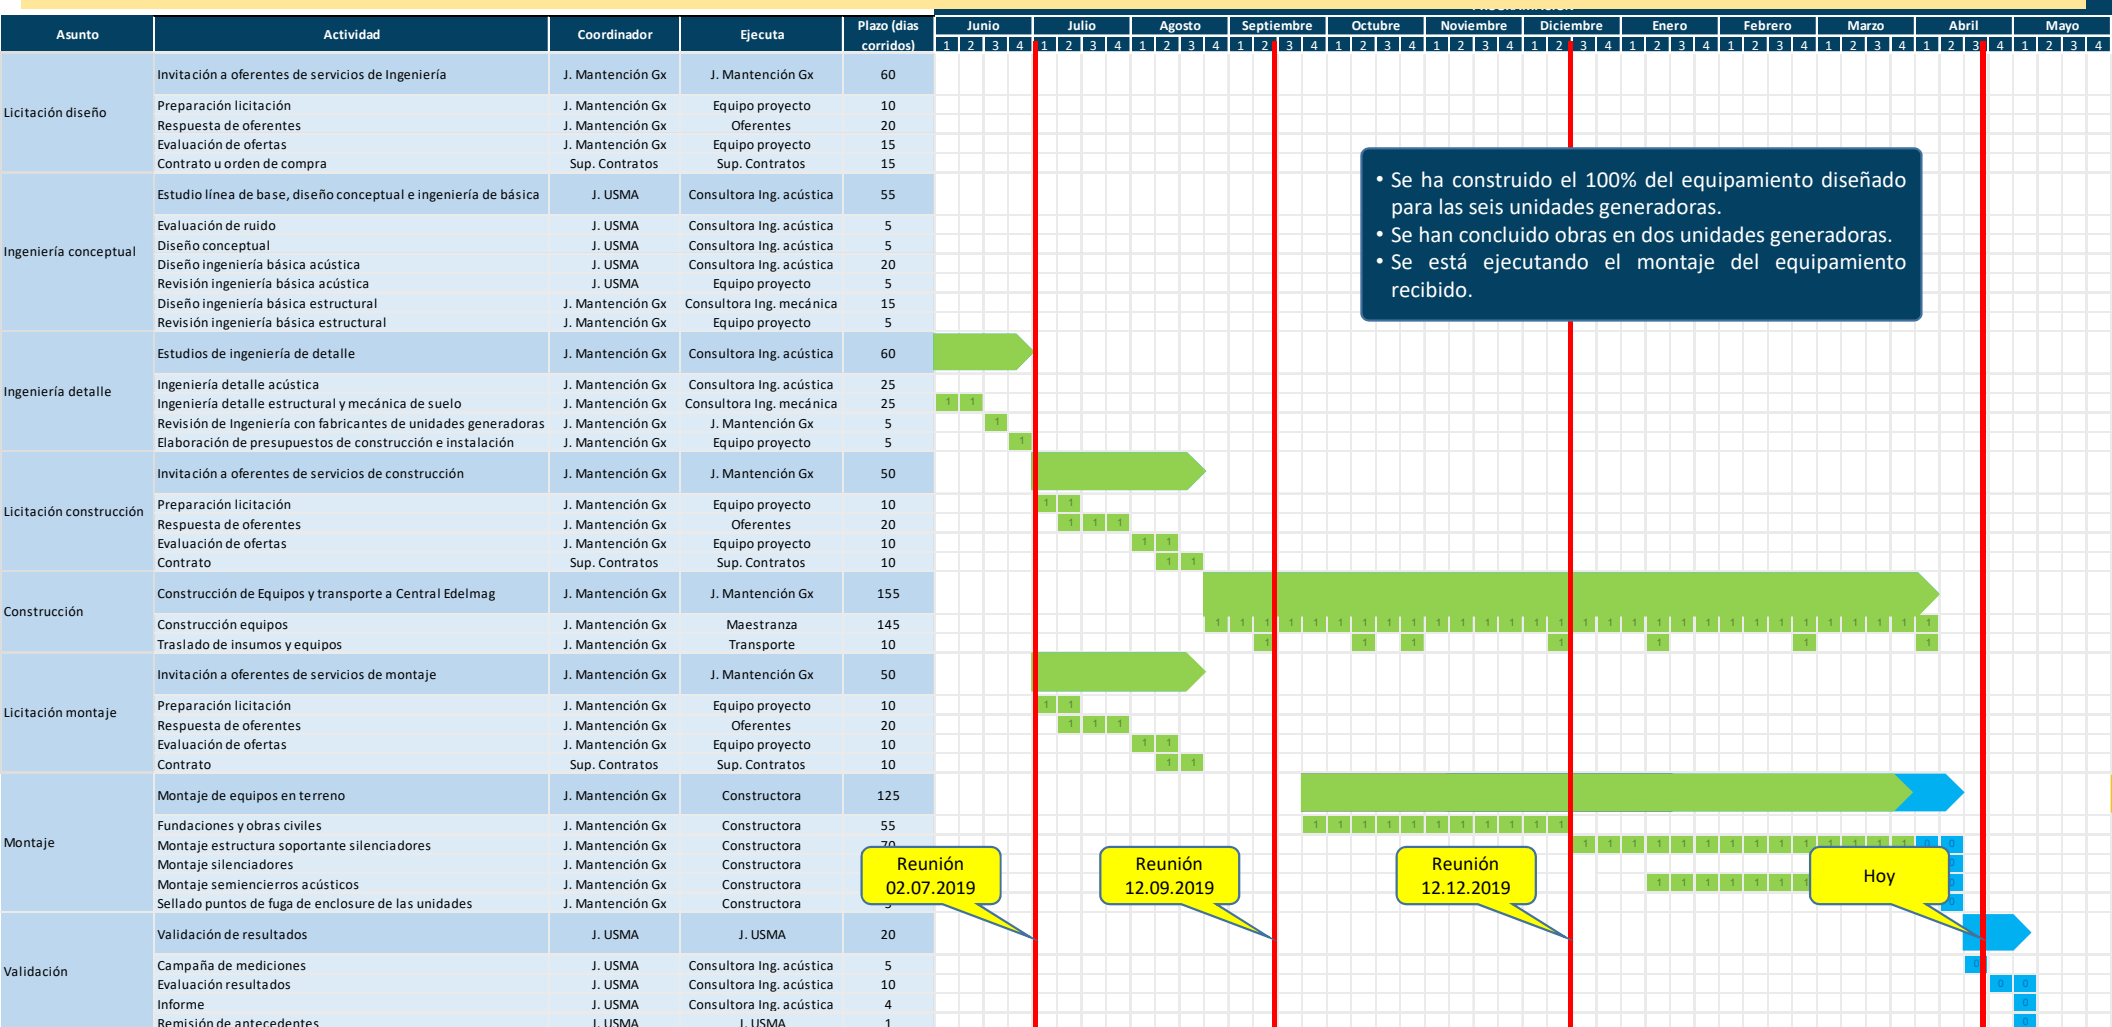

Avance 87%

## Próximos Pasos

[illegible]





**MUCHAS GRACIAS**

**edelmag**  
GRUPO CGE
