

Santiago, 11 de febrero de 2026

Señores
Superintendencia del Medio Ambiente
División de Sanción y Cumplimiento
At.: Sr. Carlos Venegas Quintriqueo
Fiscal Instructor
PRESENTE

VÍA E-MAIL

Ref.: Informa avances de implementación / DFZ-2023-309-III-NE.

Estimados,

Por medio de la presente, y en relación con las respuestas enviadas con fecha 29 de diciembre de 2025, 12 de enero de 2026 y 27 de enero pasado, informamos a esta Superintendencia, lo siguiente:

I. Seguimiento quincenal.

Conforme al compromiso adoptado por parte de Rentco SpA, según se señaló en las cartas enviadas anteriormente a esta Superintendencia, se indicó un plazo de 15 días para informar de los avances en el plan de recambio de luminarias y certificación indicados en la misma.


Conforme a la carta Gantt enviada adjunta a la misiva de fecha 29 de diciembre, el plan de ejecución se encuentra dentro de los plazos señalados, contando con un 75% de avance efectivo. Para efectos de dar cuenta de lo anterior, se acompaña a la presente un informe elaborado por FERREL INGENIERIA ELECTRICA SpA.

En virtud de lo anterior, se solicita a esta Superintendencia tener presente el avance informado.

II. Documentos Acompañados.

- Informe de Avance de Obra, de fecha 9 de febrero de 2026, emitido por Ferrel Ingeniería Eléctrica SpA.

Esperando una buena acogida a nuestra solicitud, se despide cordialmente,

Firmado por:

45CCD33B042C489...
Macarena Pérez-Iñigo O.
Abogada
RENTCO SpA



FERREL

Ingenieria Electrica

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Semanas del 02 al 09 de febrero de 2026

Proyecto: Recambio de Luminarias – Adecuación a Nueva Norma Lumínica (D.S. N°1 /2022)

Instalación: Megacentro Copiapó

Ubicación: Copiapó, Región de Atacama

Fecha: 09/02/2026

Empresa Ejecutora: FERREL Ingeniería Eléctrica SpA

1. Estado de Avance

Durante el período indicado se realizaron las siguientes actividades:

- Se Finaliza la instalación de brazos de soporte de luminaria y canalizado
- Se instalan todos los proyectores led que van en adosadas en muro en la totalidad de las naves
- El equipo se encuentra finalizando canalizaciones y cableado necesarios para llegar a los nuevos postes que se deben instalar.
- Se logra Ingreso a Agrosuper lo que permitió un avance mayor en este sector con el cambio de luminarias.

2. Avance por Sectores

- Nave Agrosuper se realiza el cambio de todas las luminarias

3. Trabajos en Ejecución

Se continúa con las siguientes labores:

- Obras civiles para iluminación del Frontis del centro
- Bases y canastillos para instalación de nuevos postes

Proyecto:	MEGACENTRO COPIAPO
Mandante:	MEGACENTRO
Contratista:	FERREL INGENIERIA ELECTRICA SPA
Fecha informe:	09-02-2026
Responsable:	FERREL INGENIERIA ELECTRICA SPA




Sector / Área	Total luminarias	Ejecutadas	Pendientes	% Avance	Observaciones
MODULO 1	19	19	0	100%	
MODULO 2	34	34	0	100%	
MODULO 3	24	24	0	100%	
MODULO 4	31	31	0	100%	
TOTEM	12	0	12	0%	
VIALES	81	49	32	60%	AVANZANDO EN OBRAS
SOLARES	14	0	14	0%	
AGROSUPER	25	22	3	88%	CAMBIO DE MAQUINA
TOTAL GENERAL	240	179	419	75%	

CONSIDERAR DENTRO DEL AVANCE
RETIRO DE LUMINARIAS ANTIGUAS
CANALIZADO Y CABLEADO PUNTOS ELECTRICOS LETREROS
MONTAJE DE BRAZOS METALICOS
OBRAS CIVILES

4. Registro Fotográfico Se adjuntan imágenes de respaldo que evidencian las condiciones descritas anteriormente.

- Cambio Luminarias Nave Agrosuper

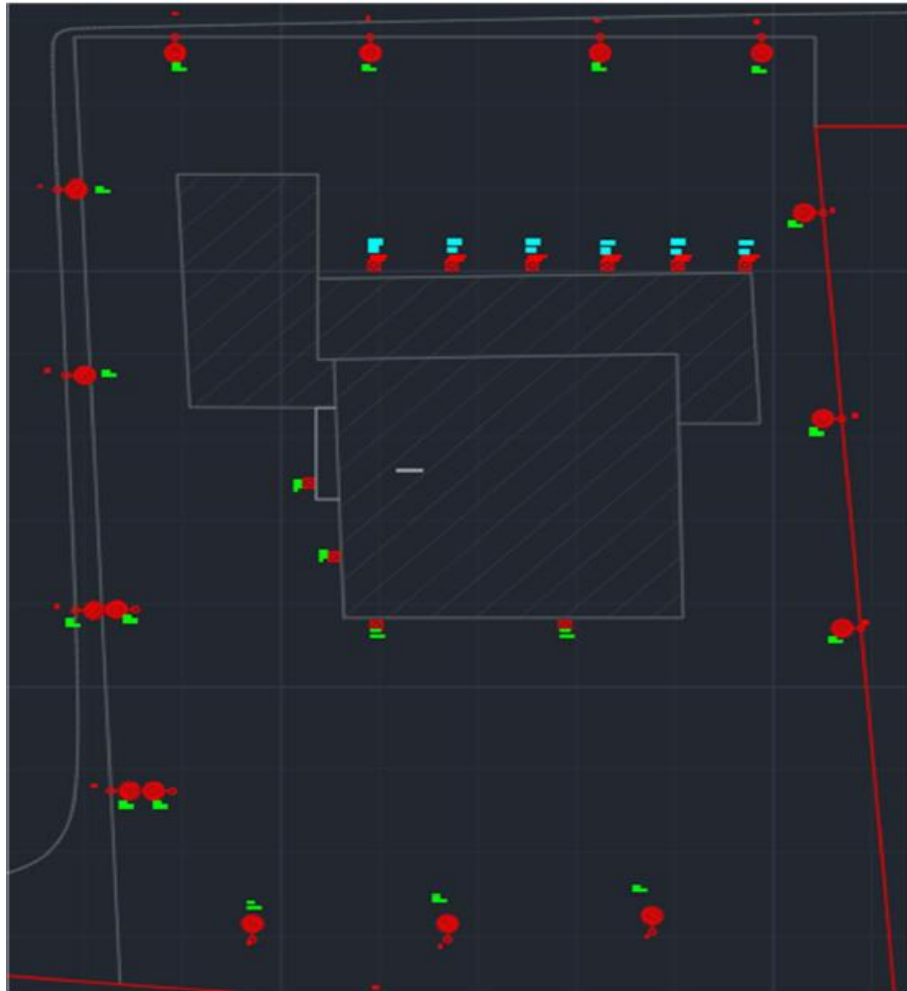



- Bases y canastillos para la instalacion de nuevos postes

