

Santiago 11 de marzo de 2021

Sr.
Emanuel Ibarra Soto
Superintendente del Medio Ambiente (S)
Presente

REF: Respuesta a Resolución Exenta N°353 del 19 de febrero de 2021


De mi consideración

En relación a la Resolución de la referencia, la presente tiene por objetivo informar que la empresa ha iniciado la implementación de las medidas solicitadas, esto es las pantallas perimetrales, los biombos para los equipos que más ruido generan hacia el entorno, los sellos de los vanos y el taller techado para labores de corte.

Las siguientes imágenes dan cuenta del estado de implementación de dichas medidas el cual se estima en los siguientes grados de avance:

Medida	Grado de avance
Pantallas perimetrales	60 %
Biombos acústicos	50 %
Sello de vanos	50 %
Taller de corte	15 %



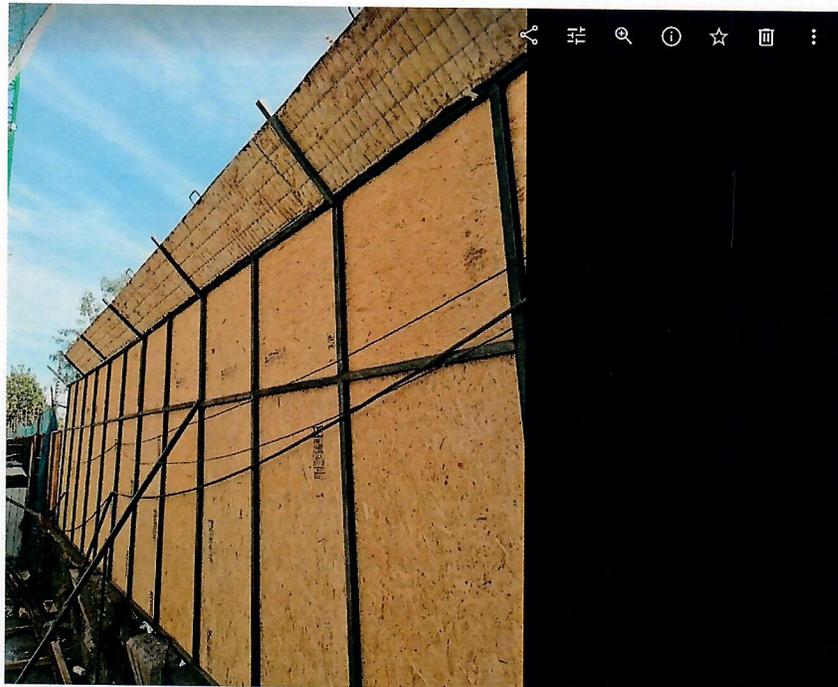


10 mar
Hoy a las 16:30 GMT-03:00

IMG_20210310_163025.jpg
12 MP 3000 x 4000 4 MB

HUAWEI MAR-LX3Bm
f/1,8 1/1028 4,75 mm ISO50

Subida desde un navegador web

Santiago

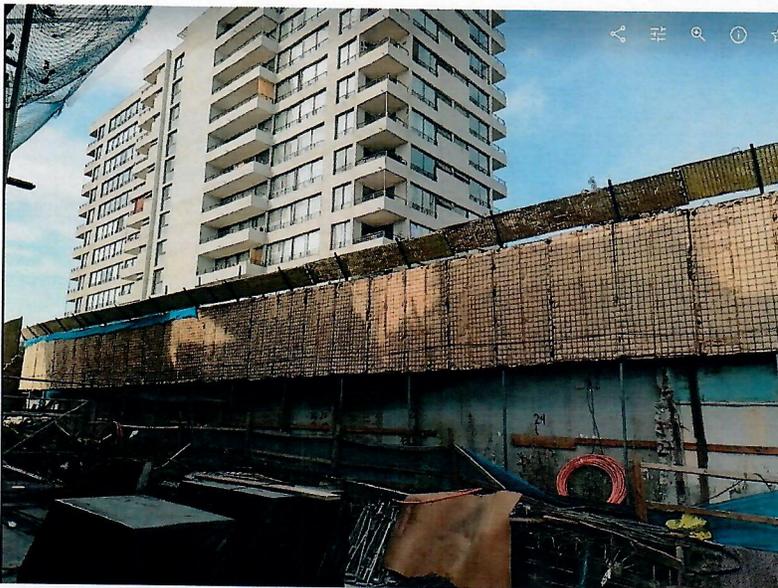

10 mar
Hoy a las 16:32 GMT-03:00

IMG_20210310_163215.jpg
12 MP 4000 x 3000 4 MB

HUAWEI MAR-LX3Bm
f/1,8 1/1504 4,75 mm ISO50

Subida desde un navegador web

Santiago



Imagen de avance de pantallas acústicas




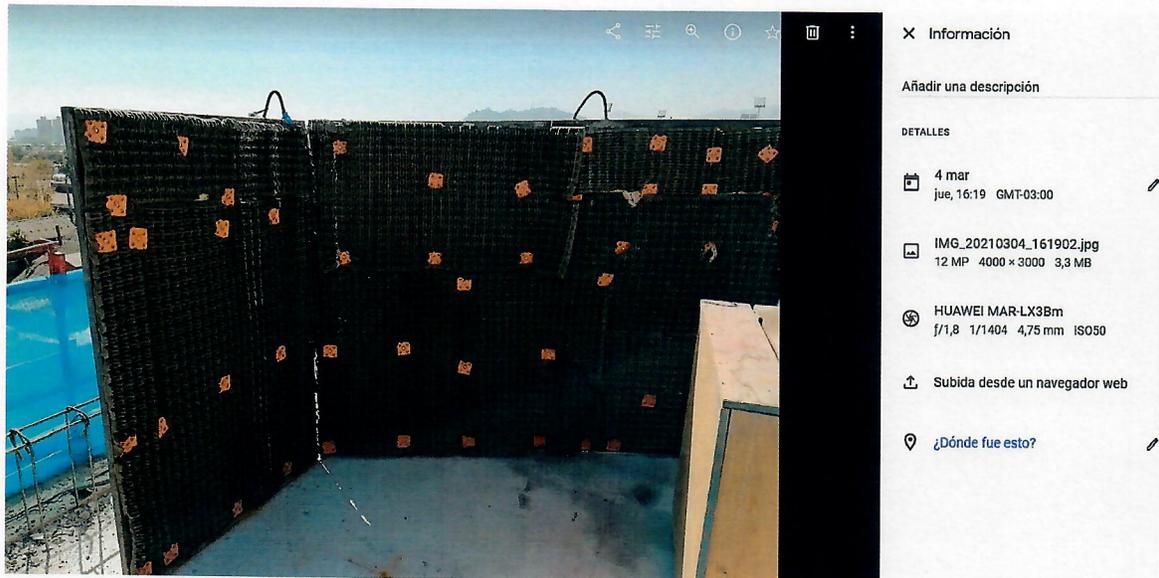


Imagen de avance de biombos acústicos



DETALLES

- 10 mar
Hoy a las 16:37 GMT-03:00
- IMG_20210310_163741.jpg
12 MP 4000 x 3000 3,9 MB
- HUAWEI MAR-LX3Bm
f/1,8 1/50 4,75 mm ISO125
- Subida desde un navegador web
- Santiago

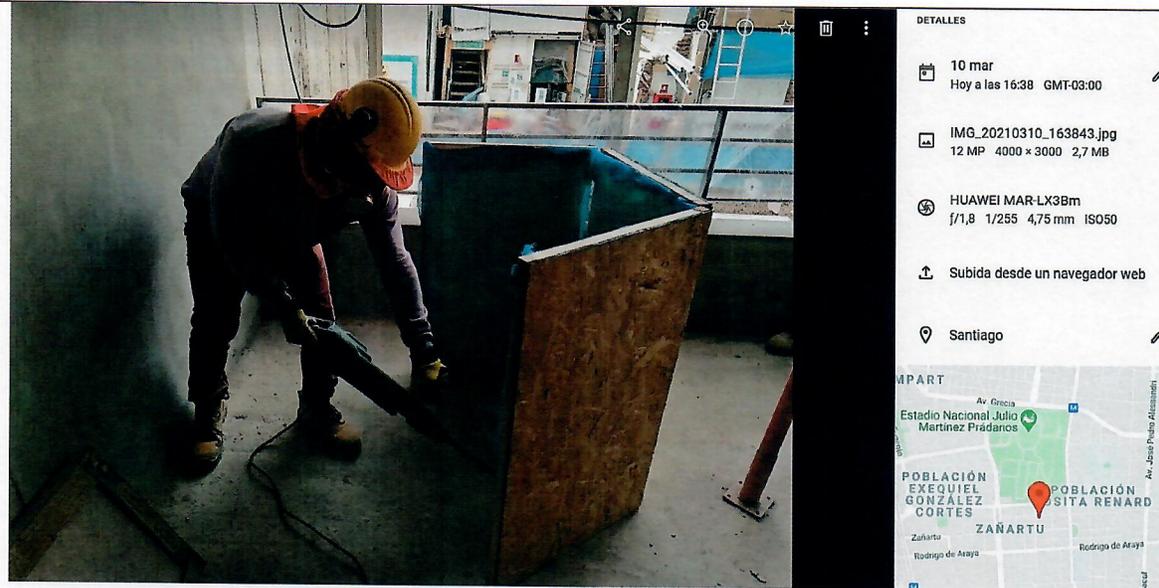

DETALLES

- 10 mar
Hoy a las 16:36 GMT-03:00
- IMG_20210310_163605.jpg
12 MP 4000 x 3000 4,5 MB
- HUAWEI MAR-LX3Bm
f/1,8 1/146 4,75 mm ISO50
- Subida desde un navegador web
- Santiago



Imagen de avance de sello de vanos



Imagen de avance de taller de corte

Cabe mencionar que dichas medidas fueron implementadas utilizando materiales disponibles en la obra para otros fines.

La presente tiene por objetivo solicitar una prórroga en el plazo de 15 días hábiles otorgados por la SMA para implementar la totalidad de las medidas de insonorización de la obra.

El motivo de esta solicitud se basa en el hecho de que los materiales requeridos para la confección de la barrera y biombos acústicos se encuentran actualmente agotados en el mercado nacional.

A continuación, se presentan imágenes correspondientes a correos electrónicos de respuesta de los proveedores de dichos materiales que dan cuenta de la inexistencia de los mismos en stock para ser provistos en este momento.

La prórroga solicitada se extiende por un plazo de 15 días hábiles adicionales, que corresponde a la fecha en que se espera tener los materiales en obra, y las medidas implementadas. Con esto, la fecha límite para tener implementadas las medidas requeridas es el 31 de Marzo del presente.

Esperando que esta solicitud tenga una buena acogida, quedo atento a sus comentarios.

Enrique Baeza Navarrete
Ingeniero Administrador de Obra
INGEVEC S.A.

~~ENRIQUE BAEZA NAVARRETE~~
~~Administrador de Obra~~
~~Constructora Ingevec S.A.~~
