

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1340-2021

Con fecha 29-11-2021 09:08:54 hrs, el titular SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ARICA Y PARINACOTA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: REPOSICION DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES COMO MEDIDA DE MITIGACION DE SECTORES CONTIGUOS A SITIO F

Región: Región de Arica y Parinacota

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-023-2019
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 02-06-2021
Fecha generación PdC electrónico: 23-08-2021
Frecuencia Reporte: Semestral
Plazo Reporte: 01-01-2022
Fiscal instructor: JOSE IGNACIO SAAVEDRA CRUZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1340-2021
Fecha de envío reporte: 29-11-2021 09:08:54
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC


Fecha de inicio: 01-07-2021
Fecha de término: 31-12-2023
N° reporte: 2 de 6.





5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

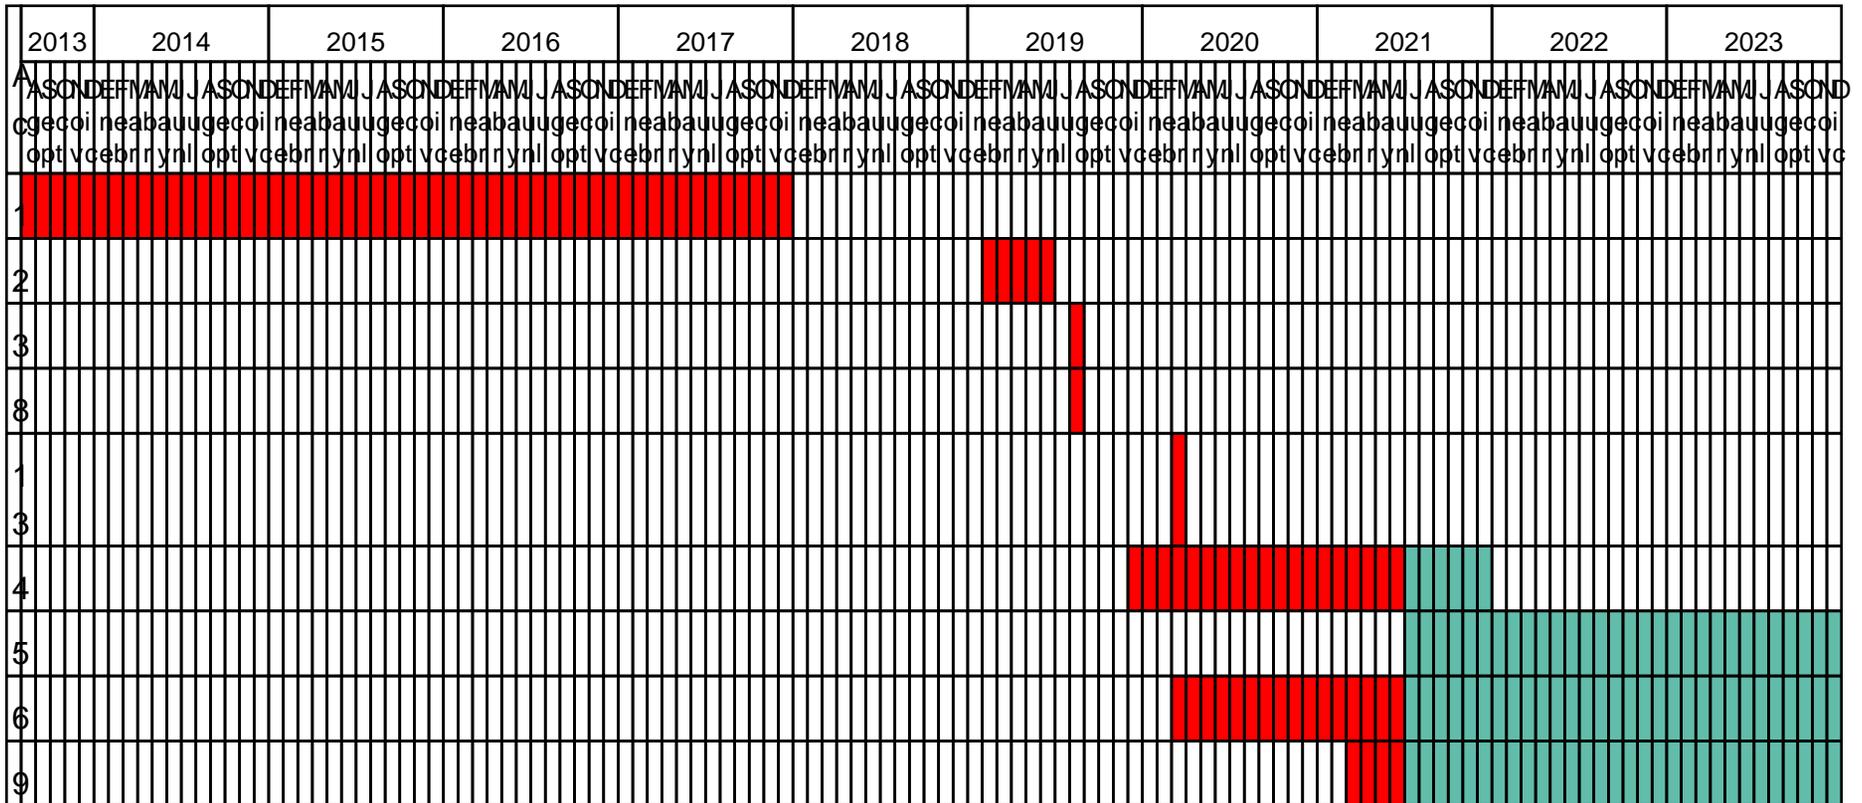



6. Reporte acciones

Hecho 2

Falta de ejecución de acciones y obras de saneamiento ambiental comprometidas en la RCA N° 35/2014, según se detalla en la Tabla 11 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Ejecución acciones y obras pendientes en el Área 2.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-12-2019
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de ejecución de las acciones y obras de saneamiento, del área 2, de acuerdo a las Tabla N° 11 de la Resolución Exenta N° 1 / ROL F-023-2019.
Forma de Implementación:	Elaboración de la resolución que Adjudica y Contrata las Obras del área 2. (Diciembre 2019 – Enero 2020). Elaboración por el ITO de la Obra del Acta de Entrega de Terreno las Obras del área 2 (3) (Enero 2020 – Marzo 2020). Seguimiento por parte de la asesoría de la Inspección Técnica de Obras y el ITO SERVIU de las partidas de remediación con informes mensuales de las Obras del área 2 mientras estén en ejecución (Enero 2020 – Septiembre 2020). Elaboración del Acta de Recepción con Reserva o Final para las obras del área 2, de acuerdo con lo estipulado en el D.S. N° 236 de (V. y U.) (Octubre 2020 – Enero 2021)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han ejecutado las acciones y obras pendientes del Área 2,



Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2019
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 3 Resoluciones de Adjudicación 3 Actas de Entrega de Terreno 4 Archivos Zip con la información de los informes de seguimiento mensual 3 Actas de Término de Obras
Medios de Verificación:	- 01-PP 09.2019 - 20191213-ResAdj-LosIndustriales1.pdf - 02-PP 10.2019 - 20191210-ResAdj-LosIndustriales1y2.pdf - 03-PP 11.2019 - 20191210-ResAdj-LosIndustriales2.pdf - 04-Acta Entrega Terreno 09.2019.pdf - 05-Acta Entrega Terreno 10.2019.pdf - 06-Acta Entrega Terreno 11.2019.pdf - 07-Acta de Recepcion con Reserva PP11 firmada.pdf - 08-Acta Recepcion de Obra con Reserva TD09.2019.pdf - 09-Acta Recepcion de Obra con Reserva TD10.2019.pdf - 10-Informe Finalización Obras Área N°2 (1).pdf - PP09-2019.7z - PP10-2019.7z - PP10-2019-Medicion_Aire.7z - PP11-2019.7z



Informes de Seguimiento:

- 97336

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/97336>

- 99505

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99505>

- 101290

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/101290>

- 103077

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103077>

- 103908

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103908>

- 113162

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113162>

- 113166

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113166>

- 116134

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116134>

- 116135

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116135>

- 116136

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116136>

- 116137

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116137>



	- 116138 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116138 - 116140 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116140
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Ejecución acciones y obras pendientes en el Área 3.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-07-2021
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% de ejecución de las acciones y obras de saneamiento, de acuerdo a las Tabla N° 11 de la Resolución Exenta N° 1 / ROL F-023-2019.



Forma de Implementación:	<p>Actualización de los diseños de proyectos del área 3 por parte de SEREMI MINVU para ingreso a SERVIU para su aprobación (Marzo 2020 – Mayo 2020).</p> <p>Elaboración por parte de SEREMI MINVU la formulación de las iniciativas de inversión que contengan los proyectos correspondientes al área 3 (2). (Mayo 2020 – Junio 2020).</p> <p>Elaboración por parte de SEREMI MINVU oficio solicitando financiamiento y colocar en tabla del CORE para los proyectos correspondientes al área 3 (2) (Junio 2020 – Julio 2020). Elaboración de anexo complementarios, especificaciones y presupuesto para iniciar proceso de licitación y su publicación en diario de circulación nacional, regional o medios digitales para proyectos correspondientes al área 3 (2) (Julio 2020 – Diciembre 2020). Elaboración de la resolución que Adjudica y Contrata las Obras del área 3 (Marzo 2021 – Abril 2021).</p> <p>Elaboración por el ITO de la Obra del Acta de Entrega de Terreno las Obras del área 3 (2) (Abril 2021 – Mayo 2021).</p> <p>Seguimiento por parte de la asesoría de la Inspección Técnica de Obras y el ITO SERVIU de las partidas de remediación con informes mensuales de las Obras del área 3 mientras estén en ejecución (Mayo 2021 – Diciembre 2021).</p> <p>Acta de Recepción con Reserva o Final para las obras del área 3, de acuerdo con lo estipulado en el D.S. N° 236 de (V. y U.) (Diciembre 2021 – Marzo 2022). 6. Acción</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Las Especificaciones Técnicas se encuentran en revisión y subsanación de observaciones, por lo que se adjunta minuta de observaciones del SERVIU, a la fecha solo se puede reportar que se está en trabajando en los antecedentes.
Fecha Inicio Efectivo:	04-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta de subsanación de observaciones.
Medios de Verificación:	- Minuta Subsancion_Area 3 PUI_08.21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Ejecución acciones y obras pendientes en el Área 4.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-03-2020
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% de ejecución de las acciones y obras de saneamiento, de acuerdo a las Tabla N° 11 de la Resolución Exenta N° 1 / ROL F-023-2019.



Forma de Implementación:	<p>Actualización de los diseños de proyectos del área 4 por parte de SEREMI MINVU para ingreso a SERVIU para su aprobación (Marzo 2020 – Abril 2020).</p> <p>Elaboración por parte de SEREMI MINVU la formulación de las iniciativas de inversión que contengan los proyectos correspondientes al área 4 (2). (Abril 2020 – Mayo 2020).</p> <p>Elaboración por parte de SEREMI MINVU oficina solicitando financiamiento y colocar en tabla del CORE para los proyectos correspondientes al área 4 (2) (Mayo 2020 – Julio 2020).</p> <p>Elaboración de anexo complementarios, especificaciones y presupuesto para iniciar proceso de licitación y su publicación en diario de circulación nacional, regional o medios digitales para proyectos correspondientes al área 4 (2) (Noviembre 2020 – Enero 2021).</p> <p>Elaboración de la resolución que Adjudica y Contrata las Obras del área 4 (Marzo 2021 – Abril 2021). Elaboración por el ITO de la Obra del Acta de Entrega de Terreno las Obras del área 4 (2) (Abril 2021 – Mayo 2021).</p> <p>Seguimiento por parte de la asesoría de la Inspección Técnica de Obras y el ITO SERVIU de las partidas de remediación con informes mensuales de las Obras del área 4 mientras estén en ejecución (Mayo 2021 – Enero 2022). Acta de Recepción con Reserva o Final para las obras del área 4, de acuerdo con lo estipulado en el D.S. N° 236 de (V. y U.) (Febrero 2022 – Abril 2022).</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan los medios verificadores que dan cuenta de que se están ejecutando las acciones comprometidas en el Plan de Cumplimiento, a la fecha las obras se encuentran en ejecución.
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los medios de verificación de dos proyectos asociados al Área 4, los que corresponden a la Etapa I y Etapa 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Fichas IDI 2 Certificados de Disponibilidad Presupuestaria 2 Decretos de Identificación de Presupuesto 2 Resoluciones de Adjudicación de Contrato 2 Actas de Entrega de Terreno



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 20200528-FicIDI-Area4_Etapall.PDF - 20200528-FicIDI-Area4-Etapal.pdf - 20210104-DeldPr-Area4_Etapal.pdf - 20210128-CertDP-Area4_Etapal.pdf - 20210201-DeldPr-Area4_Etapall.pdf - 20210323-CertDP-Area4_Etapall.pdf - 20210330-ResAdj-Area4_Etapal.pdf - 20210503-ResAdj-Area4_Etapall.pdf - 20210507-AcEnTe-Area4_Etapal.pdf - 20210624-AcEnTe-Area4_Etapall.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

Superación de parámetro de As en Bandejón central de Av. Renato Rocca sobre valor establecido en RCA 14/2013 (As 20 mg/kg), según consta en las Tabla 14 y Tabla 15 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Remediación del suelo, a fin de no superar los parámetros de As comprometidos en RCA N°35/2014 (20 mg/Kg) en el bandejón central de Av. R. Rocca, los trabajos de remediación se realizarán en Av. R. Rocca como parte del área 3.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-03-2021
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Incorporación en las Especificaciones Técnicas un ítem de retiro de primera capa de suelo y un ítem de toma de muestras de arsénico post ejecución de la partida de remediación en 5 puntos representativos de Av. Renato Rocca georeferenciados, el cual demuestre que se está por debajo de los 20 mg/Kg de arsénico en proyectos del área 3.
Forma de Implementación:	Se desarrollará en las especificaciones técnicas de los proyectos del área 3 un ítem de toma de muestras y análisis de As del material de reemplazo para asegurar que los niveles de Arsénico han disminuido en el sector a remediar.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Esto se incorporará en la Especificaciones Técnicas que se encuentran en revisión, dado que se espera licitar el año 2022, de existir disponibilidad presupuestaria, considerando las prioridades de Hacienda en el marco de las instrucciones que imparta, acorde a la restricción de presupuesto.
Fecha Inicio Efectivo:	04-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta de observaciones al proyecto Área 3.
Medios de Verificación:	- Minuta Subsancion_Area 3 PUI_08.21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Incorporar en Especificaciones Técnicas de los proyectos del área 3 un ítem de toma de muestras de Arsénico post ejecución.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-07-2021
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Incorporación en las Especificaciones Técnicas un ítem de retiro de primera capa de suelo y un ítem de toma de muestras de arsénico post ejecución de la partida de remediación en 10 puntos representativos del área 3, el cual demuestre que se está por debajo de los 20 mg/Kg de arsénico en proyectos del área 3.
Forma de Implementación:	Se desarrollará en las especificaciones técnicas de los proyectos del área 3 un ítem de toma de muestras y análisis de As del material de reemplazo para asegurar que los niveles de Arsénico han disminuido en el sector a remediar.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan las Especificaciones Técnicas del Área 3, las que pueden sufrir modificaciones hasta antes de la contratación de las obras que sería para el año 2022, de contar con la disponibilidad presupuestaria.
Fecha Inicio Efectivo:	04-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Especificaciones Técnicas para la contratación de las obras del Área 3 las que pueden sufrir modificaciones hasta antes de la contratación.
Medios de Verificación:	- EETT Mejoramiento EEPP Polimetales Area 3_18.01.21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
Acción:	Incorporar en Especificaciones Técnicas de los proyectos del área 4 un ítem de toma de muestras de Arsénico post ejecución.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-07-2021
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Incorporación en las Especificaciones Técnicas un ítem de retiro de primera capa de suelo y un ítem de toma de muestras de arsénico post ejecución de la partida de remediación en 10 puntos representativos del área 4, el cual demuestre que se está por debajo de los 20 mg/Kg de arsénico en proyectos del área 4.



Forma de Implementación:	Se desarrollará en las especificaciones técnicas de los proyectos del área 4 un ítem de toma de muestras y análisis de As del material de reemplazo para asegurar que los niveles de Arsénico han disminuido en el sector a remediar.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan las Especificaciones Técnicas de las Obras a Ejecutar en el Área 4 que para efectos de ejecución se divide en Etapa I y Etapa II.
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Especificaciones Técnicas Obras Área 4, que incorporan los aspectos medio ambientales.
Medios de Verificación:	- EETT MEJORAMIENTO EAPP AREA 4 POLIMETALES - FINAL 18-05-2020_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Falta de monitoreos de MP10 y MP2,5

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Seguimiento mensual de los monitoreos del MP10 y MP2,5 a través de una estación de monitoreo continuo representativa del área 2 en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA para las partidas de remediación de los proyectos del área 2.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de sedimentos
Fecha Inicio:	01-03-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de monitoreos mensuales de MP10 y MP2,5 en el sistema de seguimiento de SMA para las obras del área 2.
Forma de Implementación:	Se remitirán los resultados de los monitoreos de MP 10 y MP 2,5 para las obras del área 2 mientras estén en ejecución las obras de remediación (6 meses aprox.) y se enviarán en los reportes de avance, adicionalmente serán cargados al Sistema de Seguimiento de SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reportan los informes subidos al sistema de seguimiento del SMA, ejecutados para el Área 2, a la fecha las obras se encuentran ejecutadas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	30-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de finalizacióm dado que el sistema de seguimiento del SMA no da la posibilidad de descargar el comprobante de ingreso de la información, no obstante se han adjuntado en el punto 3 Seguimientos Ambientales, los informes relativos al Monitoreo de Calidad del Aire.
Medios de Verificación:	- Informe Finalización Obras Área N°2 (1).pdf



Informes de Seguimiento:

- 93567

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/93567>

- 94754

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94754>

- 95615

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/95615>

- 97665

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/97665>

- 99221

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99221>

- 100456

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/100456>

- 101289

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/101289>

- 102710

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/102710>

- 103912

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103912>

- 113138

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113138>

- 113141

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113141>



- 113143

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113143>

- 113149

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113149>

- 113153

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113153>

- 113156

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113156>

- 113957

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113957>

- 116126

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116126>

- 116127

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116127>

- 116128

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116128>

- 116129

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116129>

- 116130

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116130>

- 116131



	http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116131
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 14 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2021, y la fecha real de término es: 30-10-2021.



Hecho 5

Falta de monitoreo de ruido

Acciones Principales

N° Identificador:	17
Acción:	Seguimiento mensual de los monitoreos de ruido en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA para los proyectos del área 2.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	01-07-2021
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% de mediciones de ruido cargados en el sistema de seguimiento de SMA para las obras del área 2.
Forma de Implementación:	Incorporar en las Especificaciones Técnicas la obligatoriedad de realizar las mediciones de Ruido para las obras correspondientes al área 2 y cargar los informes de mediciones de ruido al Sistema de Seguimiento de SMA mientras se ejecute el Proyecto de remediación (6 meses aprox.).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El sistema para el ingreso de la información cargada no emite comprobante, por lo que se adjunta el informe final y en el paso 3 se anexan del sistema los informes subidos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2020
Fecha Término Efectivo:	29-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los informes de ruido de las obras ejecutadas.



Medios de Verificación:

- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Agosto 2020.pdf
- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Diciembre 2020 PTD10.pdf
- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Diciembre 2020 PTD11.pdf
- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Noviembre 2020 PTD 9.pdf
- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Noviembre 2020 PTD 10 .pdf
- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Septiembre 2020 PTD09 0100.pdf
- HYR088-20 Informe de Ruido DS 38 - Constructora MAGA - Septiembre 2020 PTD11 0100.pdf
- TD09_HYR023-20 Mediciones de ruido DS 38 - SERVIU v2.pdf



Informes de Seguimiento:

- 97336

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/97336>

- 99505

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99505>

- 101290

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/101290>

- 103077

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103077>

- 103908

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/103908>

- 113166

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113166>

- 116134

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116134>

- 116135

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116135>

- 116136

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116136>

- 116137

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116137>

- 116138

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116138>



	- 116139 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116139 - 116140 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/116140
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	20
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	01-07-2021
Fecha Término:	31-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes, medios de verificación determinados en el PdC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de ingreso de las acciones ejecutadas subidos y reportados en plazo.
Fecha Inicio Efectivo:	24-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante entregado del sistema del reporte de las acciones ejecutadas.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210924171330.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 29-11-2021 9:08



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

