

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1272-2021

Con fecha 24-09-2021 17:13:30 hrs, el titular SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ARICA Y PARINACOTA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: REPOSICION DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES COMO MEDIDA DE MITIGACION DE SECTORES CONTIGUOS A SITIO F

Región: Región de Arica y Parinacota

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-023-2019
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 02-06-2021
Fecha generación PdC electrónico: 23-08-2021
Frecuencia Reporte: Semestral
Plazo Reporte: 01-01-2022
Fiscal instructor: JOSE IGNACIO SAAVEDRA CRUZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1272-2021
Fecha de envío reporte: 24-09-2021 17:13:29
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC


Fecha de inicio: 01-07-2021
Fecha de término: 31-12-2023
N° reporte: 1 de 6.





5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

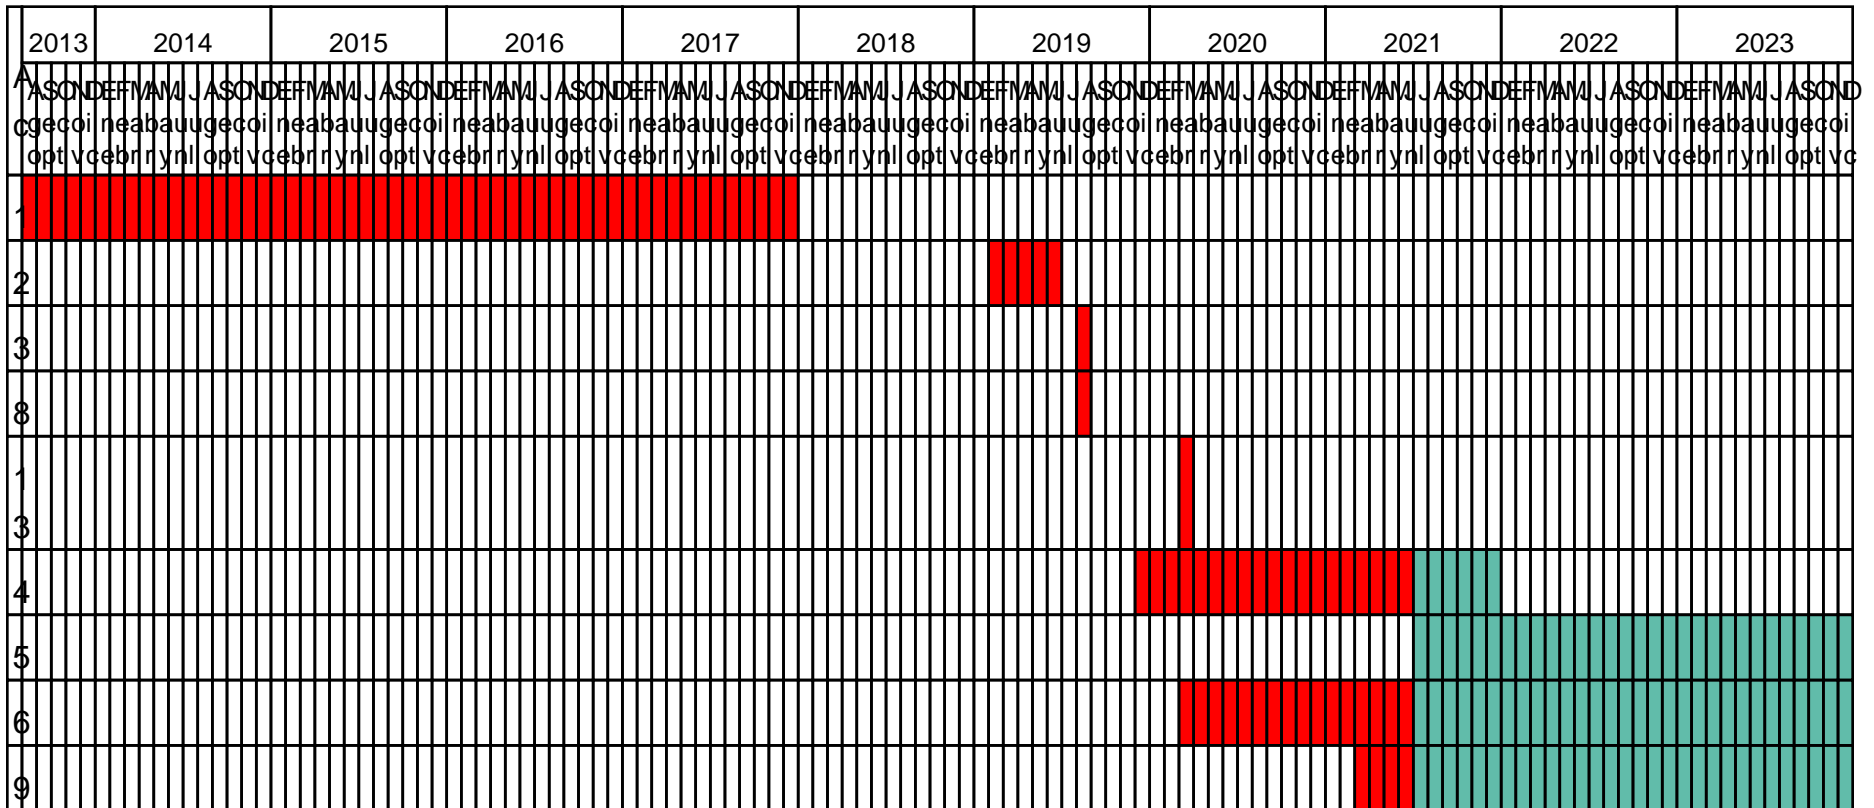



6. Reporte acciones

Hecho 1

Atraso en la ejecución de acciones y obras de saneamiento ambiental comprometidas en la RCA N° 35/2014, según se detalla en la Tabla 10 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Ejecución de las Obras de Remediación declaradas en la Tabla N° 10 de la Res. Ex. N° 1 / ROL F-023-2019.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-08-2013
Fecha Término:	20-12-2017
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las Actas de inicio de los proyectos mencionados en la tabla N° 10 de la Res. Ex. N° 1 / ROL F-023-2019. 100% de las cartillas de control de los proyectos mencionados en la tabla N° 10 de la Res. Ex. N° 1 / ROL F-023-2019.
Forma de Implementación:	Elaboración de las Actas de inicio, término de obras y cartillas de control asociadas a los proyectos.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan las actas de inicio y término de las obras comprometidas acorde a la tabla N°10 de la Resolución Exenta N°1, en el PdC y que fueron parte de la contestación de la Demanda Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	26-09-2013
Fecha Término Efectivo:	29-12-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	4 Actas de Inicio de Obras 4 Actas de Recepción de Obras



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Area1-ActaEntregaTerreno-R.Rocca.pdf - Area1-ActaRecepcion-R.Rocca.pdf - Area2-ActaEntregaTerreno-Tupungato.pdf - Area2-ActaRecepcion-Tupungato.pdf - Area3-ActaEntregaTerreno-Azolas.pdf - Area3-ActaRecepcion-Azolas.PDF - Area4-ActaEntregaTerreno-Azolas.pdf - Area4-ActaRecepcion-Azolas.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-12-2017, y la fecha real de término es: 29-12-2017.



Hecho 2

Falta de ejecución de acciones y obras de saneamiento ambiental comprometidas en la RCA N° 35/2014, según se detalla en la Tabla 11 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Solicitud de Identificación Presupuestaria a DIPRES - HACIENDA de los proyectos correspondientes a los proyectos Área 2.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	11-02-2019
Fecha Término:	10-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	100% de los proyectos del área 2 (27) con solicitud de identificación presupuestaria.
Forma de Implementación:	Se realizará desde la región la solicitud al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de incorporar dentro de las iniciativas de inversión del año 2019 las obras relacionadas con el área 2.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la gestión con el nivel central para la identificación del presupuesto requerido para la ejecución de las obras del Área 2 Polimetales.
Fecha Inicio Efectivo:	11-02-2019
Fecha Término Efectivo:	05-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan oficio enviado del SEREMI al Subsecretario, la Respuesta al oficio y el Decreto de Identificación presupuestaria tramitado.
Medios de Verificación:	- DT - 1045.pdf - ORD. N° 124 11.02.2019 SEREMI - SERVIU Incorporación PUI.pdf - ORD. N° 274 10.06.2019 DIPRES-HACIENDA.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-06-2019, y la fecha real de término es: 05-08-2019.

N° Identificador:	3
Acción:	Anexo Complementario y Publicación Llamado a licitación (3) proyectos Área 2.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	01-08-2019
Fecha Término:	31-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	100% de los proyectos del área 2 con resolución de aprobación de anexo complementario para llamado a licitación (3) y publicación.
Forma de Implementación:	Elaboración de anexo complementarios, especificaciones y presupuesto para iniciar proceso de licitación y su publicación en diario de circulación nacional, regional o medios digitales.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa cumplimiento en relación a las aprobaciones mediante los respectivos actos administrativos de los anexos complementarios para el llamado a Licitación, lo que da cuenta por medio el llamado que se realiza mediante un diario de circulación regional acorde lo exige el DS 236 VyU de 2002
Fecha Inicio Efectivo:	16-08-2019
Fecha Término Efectivo:	16-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan 3 Resoluciones que aprueban Anexos complementarios y una imagen de la publicación de las propuestas públicas en un diario regional.



Medios de Verificación:	- 20190816-ReApBa-IndustrialesI_Area2_Polimetales.pdf - 20190816-ReApBa-IndustrialesII_Area2_Polimetales.pdf - 20190816-ReApBa-IndustrialeslyII_Area2_Polimetales.pdf - PublicacionDiario-16_08_19_pag_03-550-4243ac.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

Superación de parámetro de As en Bandejón central de Av. Renato Rocca sobre valor establecido en RCA 14/2013 (As 20 mg/kg), según consta en las Tabla 14 y Tabla 15 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Incorporar en Especificaciones Técnicas de los proyectos del área 2 un ítem de toma de muestras de Arsénico del material de reemplazo post ejecución.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	01-08-2019
Fecha Término:	31-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las Especificaciones técnicas desarrolladas con este nuevo ítem para los proyectos del área 2.
Forma de Implementación:	Se desarrollará en las especificaciones técnicas de los proyectos del área 2 un ítem de toma de muestras y análisis de As del material de reemplazo para asegurar que los niveles de Arsénico han disminuido en el sector a remediar.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	ACorde a lo comprometido se incorpora en las Especificaciones Técnicas acápite en relación a la toma de muestras de Arsénico.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2019
Fecha Término Efectivo:	01-10-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	3 Especificaciones Técnicas dela área 2



Medios de Verificación:	- EETT_Mejoramiento_EEPP_Los_Industriales_I_Polimetales_Étapa II_compressed.pdf - EETT_Mejoramiento_EEPP_Los_Industriales_II_Polimetales_Étapa II_compressed.pdf - EETT_Mejoramiento_EEPP_Los_Industriales_IyII_Polimetales_Étapa II_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-08-2019, y la fecha real de término es: 01-10-2019.



Hecho 4

Falta de monitoreos de MP10 y MP2,5

Acciones Principales

N° Identificador:	13
Acción:	Monitoreos de MP 10 y MP 2,5 realizados en Av. Renato Rocca y Av. Alejandro Azolas y posterior carga al Sistema de Seguimiento SMA.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de sedimentos
Fecha Inicio:	02-03-2020
Fecha Término:	02-03-2020
Indicadores de Cumplimiento:	100% informes cargados al Sistema de Seguimiento SMA.
Forma de Implementación:	Carga de los monitoreos de MP 10 y MP 2,5 en el Sistema de Seguimiento SMA
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da cumplimiento a la acción definida, en relación al seguimiento mensual en relación a los monitoreos de MP 10 y MP 2,5 e Av. Renato Rocca.
Fecha Inicio Efectivo:	16-05-2016
Fecha Término Efectivo:	12-08-2016
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	10 Informes



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Línea base sector avda Azola_07132021_091941.pdf - 2 Línea base sector avda Azola tramo 1 lmt_07132021_092133.pdf - 3 remediación calle azolas rivera tramo n 3-4_07132021_092400.pdf - 4 línea base sector avenida azola tramo 4_07132021_092611.pdf - 5 línea base sector avenida azola tramo 4 solom-chavez si_07132021_093257.pdf - 6 remediación calle azolas sector solom chavez tramo 5_07132021_093548.pdf - 7 remediación calle azolas subsector andrade tramo n6_07132021_094113.pdf - 8 remediación calle azolas podesta tramo 7_07132021_094313.pdf - 9 línea base sector avda azolas tramo 7-8_07132021_094616.pdf - 10 remediación calle azolas tramo n8_07132021_094804.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 24-09-2021 17:13



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

