

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3029-2025

Con fecha 16-06-2025 18:04:55 hrs, el titular SURALIS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PTAS PANGUIPULLI  
**Región:** Región de Los Ríos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-020-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 9 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 24-07-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:**  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 13-08-2024  
**Fiscal instructor:** JAVIERA VALENCIA MUÑOZ

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-3029-2025  
**Fecha de envío reporte:** 16-06-2025 18:04:54 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Avance


### 4. Estado de avance del PdC


**Fecha de inicio:** 02-08-2018  
**Fecha de término:** 31-07-2026  
**N° reporte:** 25 de 33.




## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

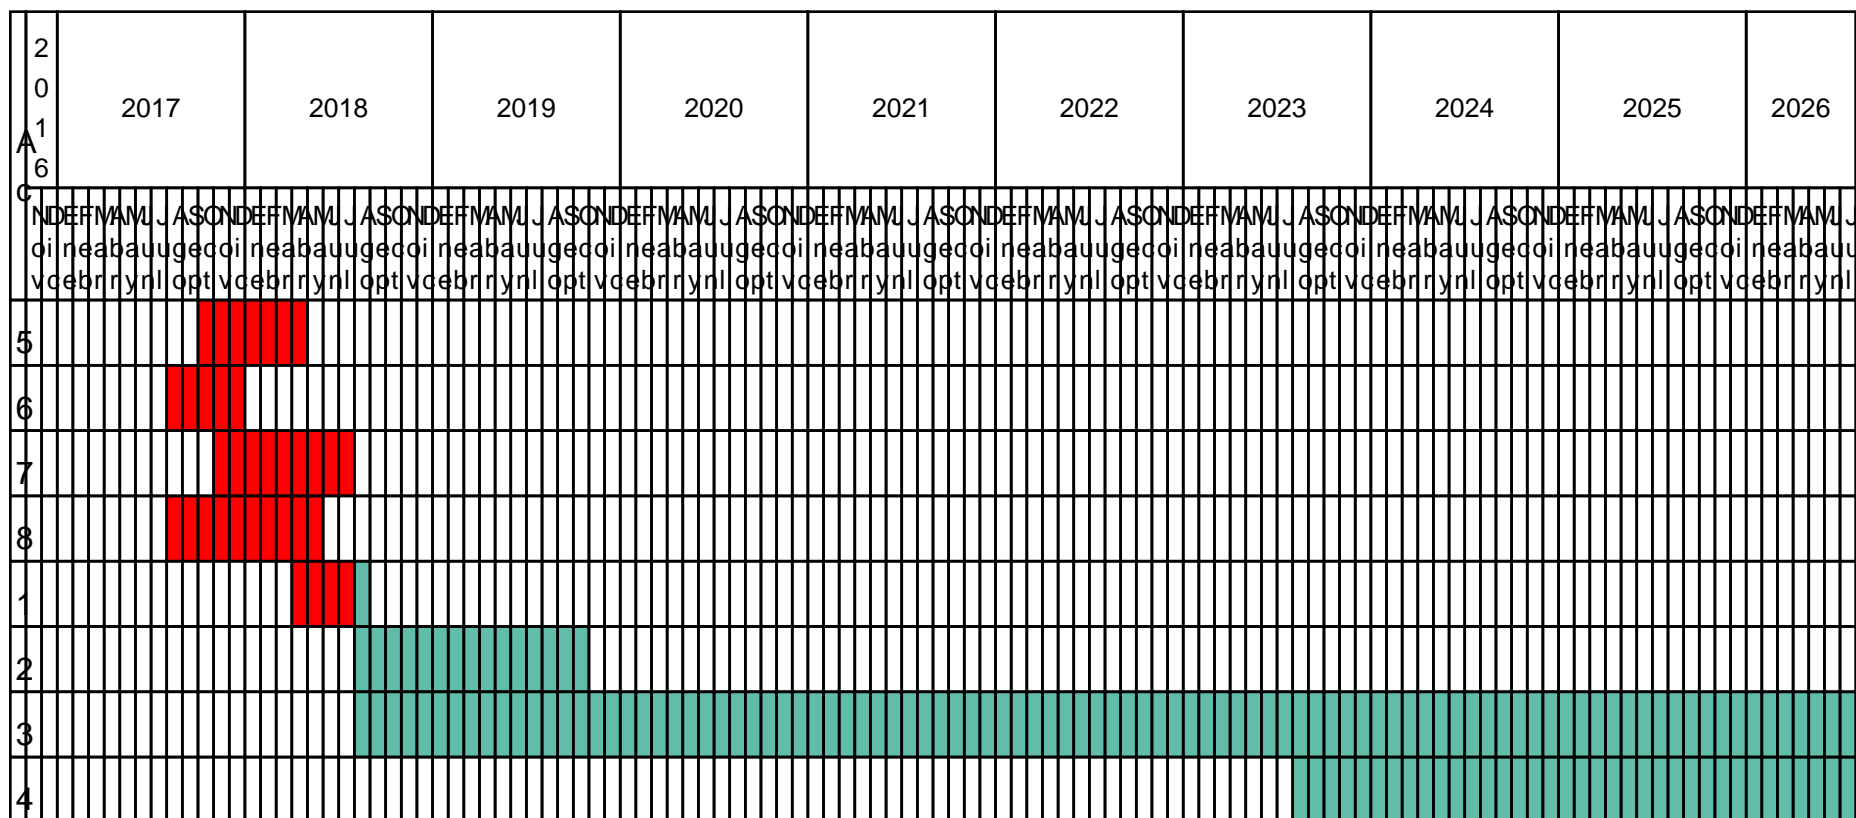

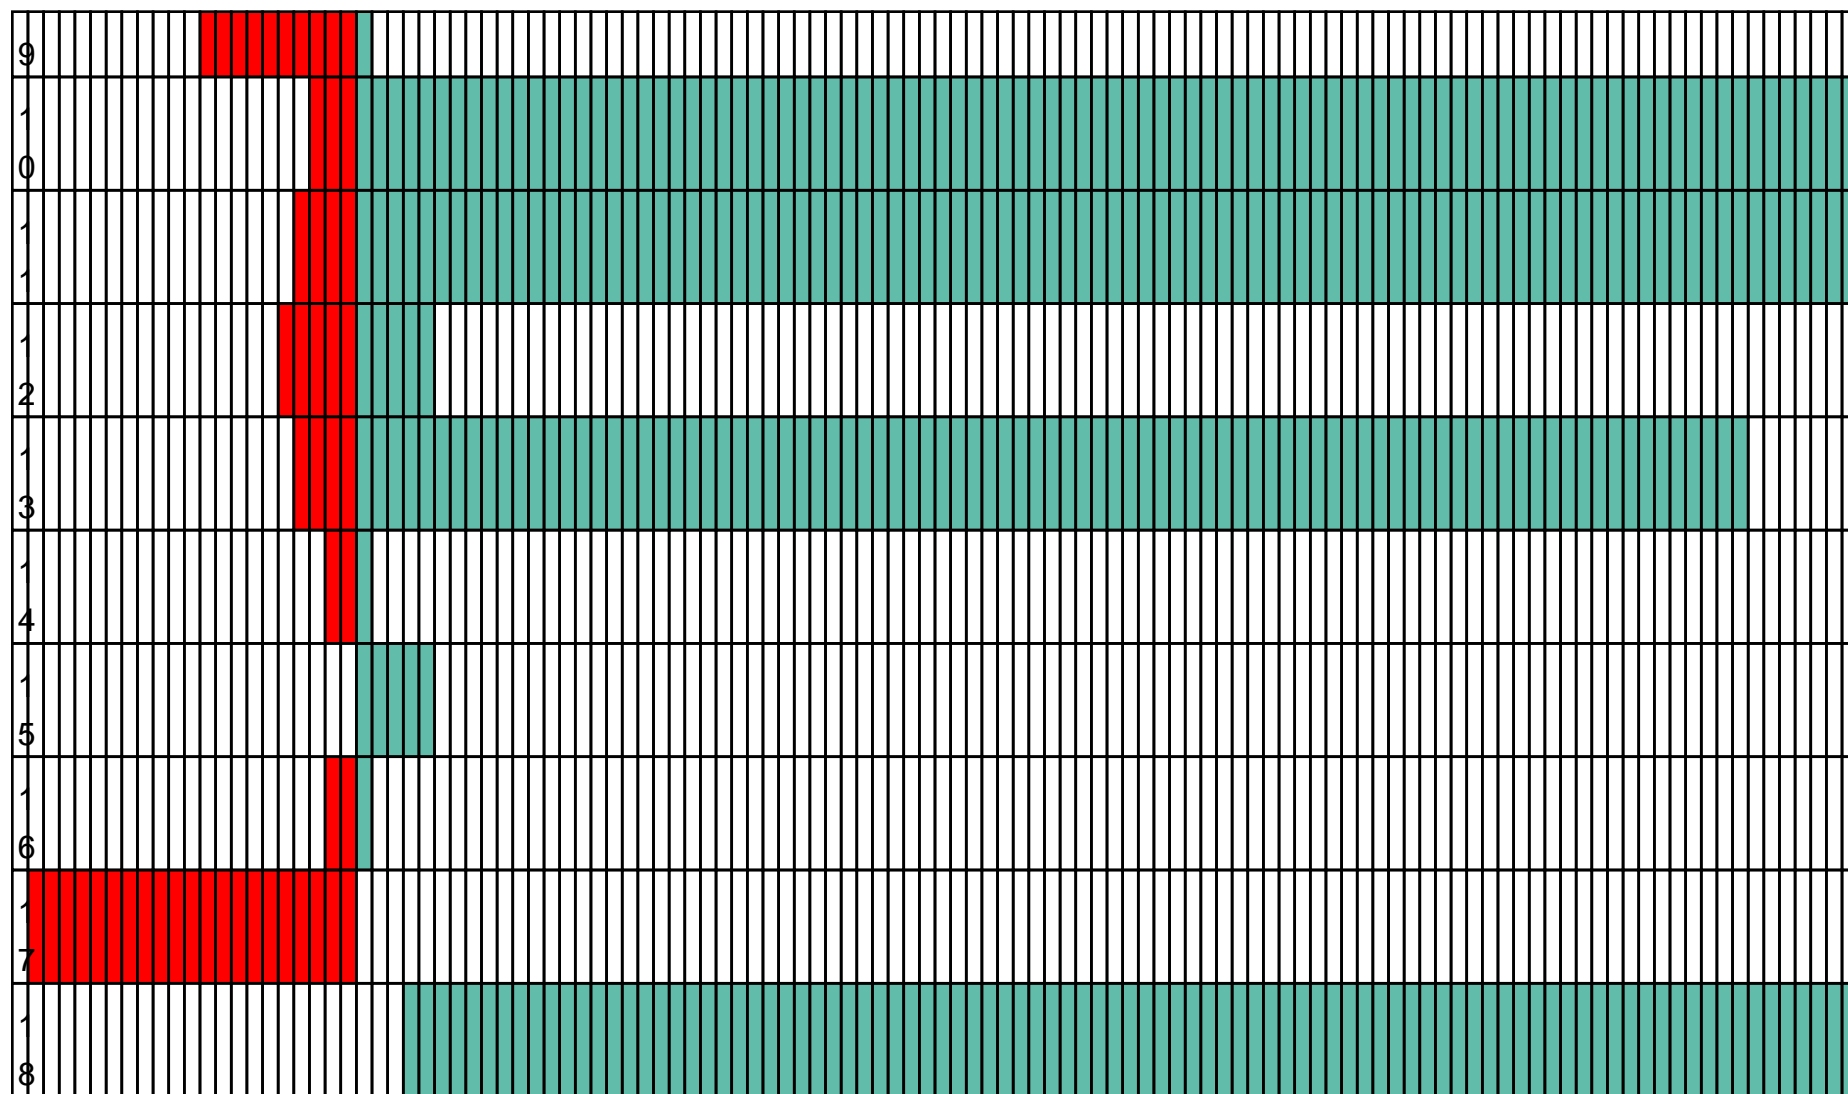

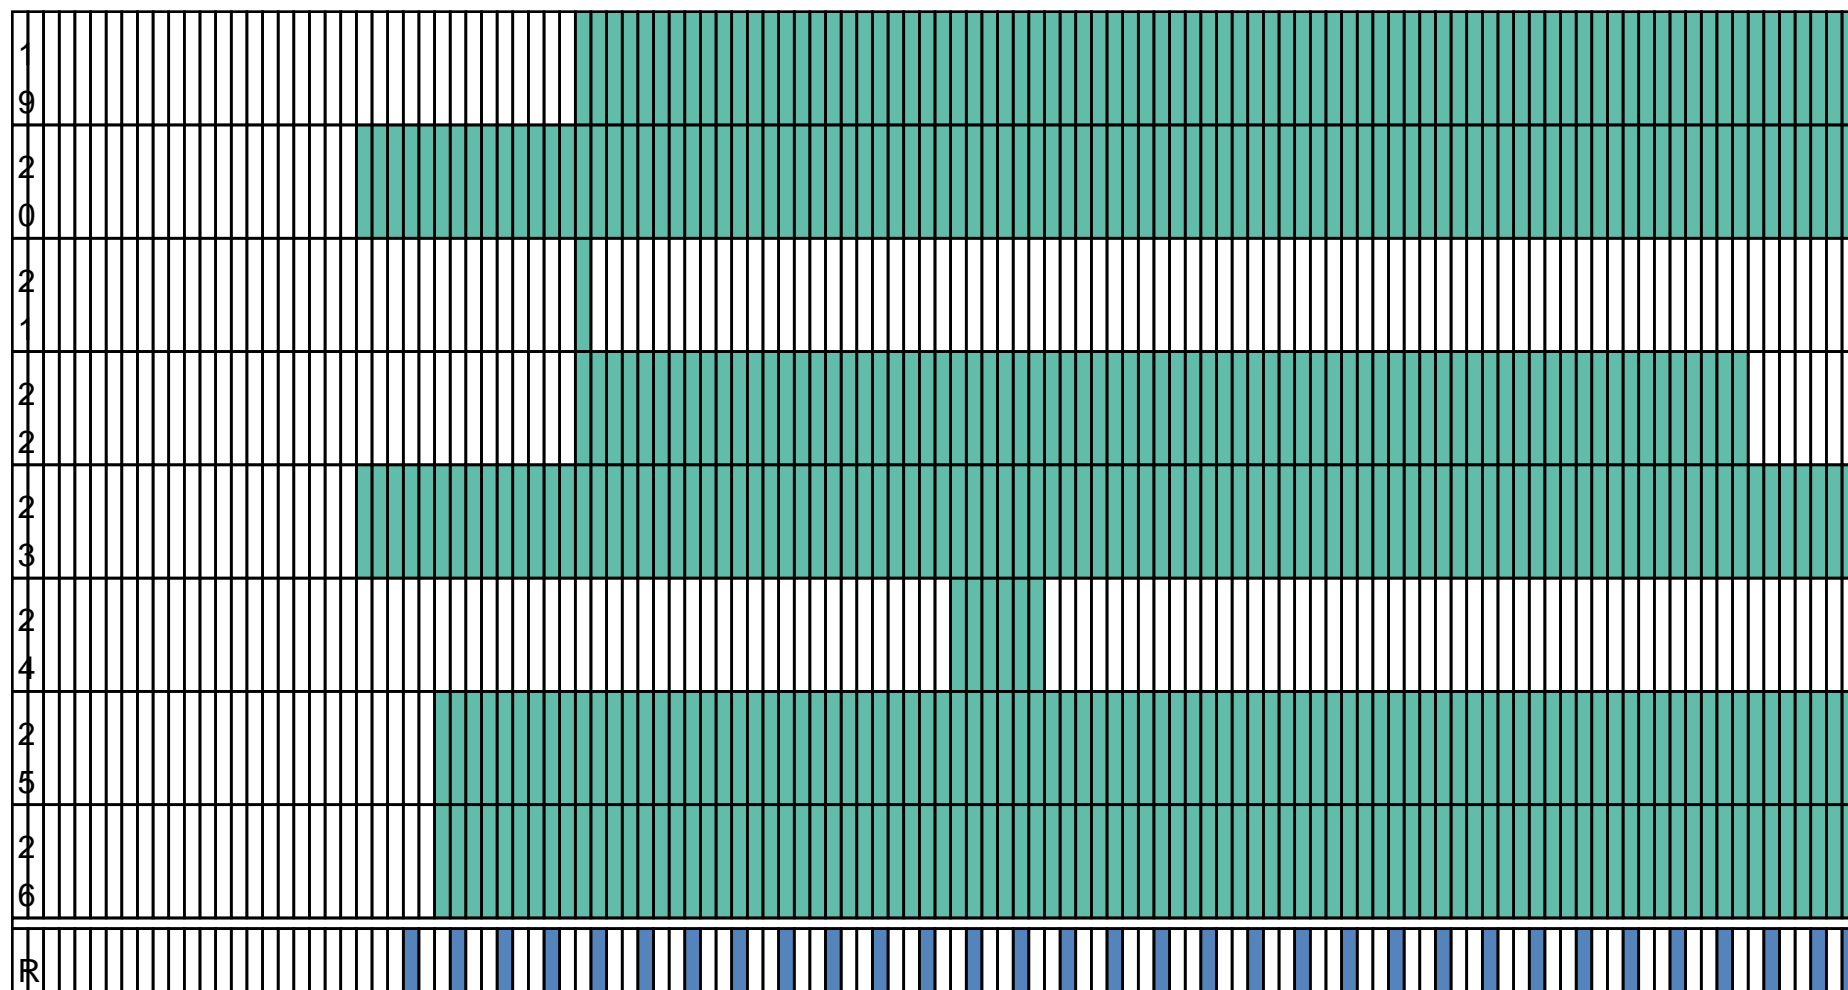

## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Los monitoreos del cuerpo receptor, Estero Anueraque, se realizan en puntos diversos a lo establecido en la evaluación ambiental de la RCA N°66/1997, tal como se indica en los considerandos 13 y 14 de la presente resolución

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC. Meta: Informar a la SMA por la plataforma digital del SDPC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	02-08-2018
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la información reportada a la SMA
Forma de Implementación:	1. Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	4.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



**Estado de Avance Reportado:**

Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N°24 del PdC, se debe considerar que los plazos del PdC en su conjunto fueron extendidos conforme lo indicado en primera instancia por las Resoluciones Exentas N° 11 y 13 (del 25 de julio de 2019 y 5 de noviembre de 2020, respectivamente); y en segunda instancia por las Resoluciones Exentas N° 14 y 15 (del 1 de abril de 2021 y 4 de agosto de 2022, respectivamente). Lo anterior debido a temas asociados a los plazos de la evaluación ambiental del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli”, y, por tanto, de las acciones del PdC asociadas a dicho proceso.

Para el presente periodo correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024, se menciona que de acuerdo a lo señalado en la Res. Ex. N°15/2022 de la SMA, el presente PdC tiene como hito de término la entrega del reporte final el que quedó sujeto a los 30 días hábiles posteriores al término de la acción más larga del PdC (acción N°18), estableciendo como fecha final para la ejecución del PdC el 11 de septiembre de 2023. Sin embargo, debido a dilaciones en el proceso de evaluación ambiental (Acción N°22) relacionado al presente PdC, no se ha podido culminar antes de la fecha anteriormente mencionada, quedando inhabilitada la posibilidad de reportar a través del SPDC, activando por lo tanto la Acción Alternativa N°4 la cual considera enviar el reporte de avance a través de la Oficina de Partes de la SMA. Al respecto, actualmente se está a la espera de una respuesta por parte de la SMA ante la solicitud de extensión de plazo realizada mediante la carta N°11.775/2023. Posteriormente se realizó una reunión con la SMA el 8 de mayo para evaluar el estado del presente PdC y se comprometió el envío de los antecedentes y una nueva carta para evaluar la extensión de los plazos del mismo.

**Fecha Inicio Efectivo:** 02-08-2018

**Fecha Término Efectivo:**

**Estado Actual de la Acción:** En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>01. Minuta Reporte de Avance 24 Acción 3_V0</p> <p>02. Comprobantes de reporte electrónico y por oficina de partes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobante reporte inicial</li> <li>• Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital SPDC de reportes de avance N° 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17 y 18.</li> <li>• Comprobantes electrónicos Registro envío a oficina de Partes de SMA de Reportes de avance N°9, 16, 19, 20, 21, 22, 23.</li> </ul> <p>03. Solicitud pronunciamiento plazos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta N°11.775 SMA Plazos PdC Panguipulli</li> <li>• Correo Solicitud ampliación plazos SPDC ROL D-020-2018</li> <li>• Minuta.037 Análisis de Plazos PDC</li> </ul> <p>04. Comprobante reunion de Lobby SMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión Ley Lobby</li> <li>• Reunión Lobby SMA Panguipulli</li> </ul>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Reporte de Avance 24 Acción 3_V0.pdf</p> <p>- 02. Comprobantes de reporte electrónico y por oficina de partes.rar</p> <p>- 03. Solicitud pronunciamiento plazos.rar</p> <p>- 04. Comprobante reunion de Lobby SMA.rar</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	13-08-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- 03. Comprobante Reporte avance 23 OP.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

## Acciones Alternativas

N° Identificador:	4
-------------------	---



Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA Meta: Mantener informada a la SMA sobre los avances
Tipo de Acción:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	1 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de la información en Oficina de Partes de la SMA
Forma de Implementación:	1. Ingreso de la documentación a través de la Oficina de partes de la SMA
Acción Principal:	3.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente PdC tiene como hito de término la entrega del reporte final el que quedó sujeto a los 30 días hábiles posteriores al término de la acción más larga del PdC (acción N°18), dando como fecha el 11 de septiembre de 2023. A pesar de esto, producto de dilaciones en el proceso de evaluación ambiental (Acción N°22) relacionado al presente PdC, no se ha podido culminar antes de la fecha anteriormente mencionada, quedando inhabilitada la posibilidad de reportar a través del SPDC (Acción N°3), activando por ende la presente Acción Alternativa N°4 la cual considera enviar el reporte de avance a través de la Oficina de Partes de la SMA. Indistintamente de lo anterior, y a pesar de encontrarse a la espera de la resolución por parte de la autoridad, Suralis ha permanecido comprometido con la ejecución de todas las acciones que no han finalizado de acuerdo a los cronogramas establecidos en el PdC. Durante el periodo correspondiente al actual reporte de avance N°24 (abril, mayo, junio), se menciona que se sostuvo una reunión con la SMA el 8 de mayo en la cual se abordó el estado del PdC, comprometiéndose el envío de una nueva carta y antecedentes para evaluar la extensión de plazo del mismo.
Fecha Inicio Efectivo:	13-05-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	01. Minuta Reporte de Avance 24 Accion 4_V0 02. Correo solicitud ampliación plazos SPDC ROL D-020-2018. 03. Comprobante envío reporte de avance N°23 a través de Oficina de Partes 04. Comprobante reunión de Lobby SMA
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Accion 4_V0.pdf - 02. Correo Solicitud ampliación plazos SPDC ROL D-020-2018.pdf - 03. Comprobante Reporte avance 23 OP.pdf - 04. Comprobante reunion de Lobby SMA.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3024-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

Descarga habitual y de larga duración de aguas servidas al Lago Panguipulli e implementación de nuevas unidades operativas (de pretratamiento, un segundo reactor de lodos activados y un bypass mediante el cual se descargan aguas servidas sin tratamiento al Estero Anueraque), lo que implica una modificación de consideración respecto al proyecto calificado favorablemente mediante la RCA N°66/1997

### Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	<p>Educación ambiental enfocada en el correcto uso del alcantarillado</p> <p>Meta: Mantener a la ciudadanía educada respecto al correcto uso del alcantarillado, de modo de incentivar que eliminen sus ingresos de aguas lluvias y napas del alcantarillado.</p>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de aguas lluvia
Fecha Inicio:	01-05-2018
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	- 100% de las actividades realizadas
Forma de Implementación:	1. Campañas anuales de difusión acerca del correcto uso del sistema de alcantarillado, programadas de acuerdo al plan de trabajo
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Los meses de abril, mayo y junio corresponden al reporte de avance N°24. De acuerdo con lo mencionado en el PdC, la acción N°10 compromete la realización de campañas educativas ambientales enfocadas en el uso correcto del alcantarillado por parte de Suralis. Dentro de las actividades realizadas en el presente periodo, se ha mantenido la difusión acerca de diferentes temáticas relacionadas al cuidado del alcantarillado a través de las redes sociales X e Instagram, el sitio informativo <a href="http://www.redpanguipulli.cl">www.redpanguipulli.cl</a> , el sitio web oficial de Suralis ( <a href="http://www.suralis.cl">www.suralis.cl</a> ) y medios de comunicación radial locales mediante "Radio Acústica". Además, para el presente periodo se realizaron 2 talleres sobre nociones básicas de gasfitería.
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción: 01. Minuta Reporte de Avance 24 Acción 10_V0 02. Informe Campaña Suralis segundo trimestre 2024.
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Acción 10_V0.pdf - 02. Informe Campaña Suralis segundo trimestre 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	<p>Identificar y desconectar ingresos de aguas lluvias y/o de napas a la red de alcantarillado.</p> <p>Meta: Disminuir el ingreso de aguas lluvias y de napas a la red de alcantarillado. Esto permitirá reducir el uso de los aliviaderos de emergencia, lo cual permitirá disminuir los eventuales efectos sobre el lago, tanto en su calidad de las aguas expresada en términos de la transparencia como del contenido de fosforo en sus sedimentos.</p>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de aguas lluvia
Fecha Inicio:	02-04-2018
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la acción ejecutada
Forma de Implementación:	<p>1. Efectuar una nueva revisión a la red de alcantarillado mediante la realización de pruebas de humo, medición de caudal en cuencas de la red de alcantarillado y en clientes relevantes, inspección de cámaras de alcantarillado y filmación de colectores. En el evento que se detecten ingresos directos de aguas lluvias y/o de napas a la red de alcantarillado de Essal se procederá a sellarlos. De igual modo, en el evento que se detecten ingresos de aguas lluvias y/o de napas, se notificará a los clientes detectados con conexiones irregulares de aguas lluvias y napas de acuerdo al procedimiento señalado en la acción N°9.</p> <p>2. Evaluación trimestral de la efectividad de las medidas adoptadas mediante un registro de los volúmenes del by pass en relación al consumo de agua potable y la pluviometría de la zona.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte de avance N°24 considera el periodo entre los meses de abril a junio del 2024 (segundo trimestre del año). Dentro de la acción N°11 se considera evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, mediante una comparación del registro de los volúmenes de aguas mixtas tratadas y volúmenes descargados por los aliviaderos de emergencia existentes. Por otro lado, se consideran actividades de monitoreo para la red de aguas servidas de Panguipulli, las cuales incluyeron pruebas de humo, filmaciones de cámaras pértiga y filmaciones de colectores.</p> <p>Durante el presente periodo, se registró un aumento del 19,63% en el volumen del agua tratada de la PTAS respecto del mismo periodo para el año anterior. En relación al volumen de agua sin tratar y los ingresos irregulares, se evidenció un aumento de 321,29% y 65,38% respectivamente respecto del mismo trimestre del año 2023. Se destaca por lo demás, que dichas variables son influenciadas por las precipitaciones, las cuales aumentaron un 92,7% en el mismo periodo analizado. Respecto a las aguas de “generación” lo cual corresponde a las facturaciones de los clientes, se evidenció un aumento del 3,45% en comparación al mismo trimestre del año anterior. En este punto es importante señalar que, durante el periodo a reportar (abril – junio del 2024), se ha producido en forma conjunta el aumento de ingresos irregulares y la presencia de lluvias importantes en la zona, lo que ha desencadenado la utilización de los By Pass de la red y de la planta. Sin perjuicio de lo anterior, los valores registrados siguen siendo inferiores a lo señalado en el 2° trimestre del 2019, al inicio de la ejecución de este PDC.</p> <p>Adicional a lo anterior, se informa respecto de la instalación y operación dos estanques de tormentas ubicados en la PTAS de Panguipulli. La construcción de esta infraestructura está orientada a minimizar el uso de los aliviaderos de emergencia hacia el lago Panguipulli y el estero Anueraque, ante el ingreso irregular de aguas lluvias al sistema de alcantarillado. Es importante destacar que la instalación de los estanques corresponde a un acto voluntario orientado a la contención de aguas sin tratar, sin que estos se encuentren suscritos a algún instrumento de carácter ambiental.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción:</p> <p>01. Minuta Reporte de Avance 24 Acción 11_V0 02. Balance Volumétrico 2do trimestre 2024 Panguipulli_V0 03. Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe Balance Volumétrico de Aguas segundo trimestre 2024</li> <li>• Informe de pruebas de humo</li> <li>• Informes de Filmación de colectores</li> <li>• Registro de costos (facturas)</li> </ul>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Reporte de Avance 24 Acción 11_V0.pdf - 02. Balance Volumétrico 2do trimestre 2024 Panguipulli_V0.pdf - 03. Anexos.rar</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	<p>Tramitar el permiso de concesión marítima</p> <p>Meta: Obtención de la concesión marítima</p>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	13-04-2018
Fecha Término:	30-12-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Otorgamiento de la CCMM ante la SSFFAA



Forma de Implementación:	<p>1. Se solicitará concesión marítima para sumergir y extender la descarga del aliviadero de emergencia de la PEAS Roble Huacho. Este procedimiento contiene dos etapas:</p> <p>i. Ingreso del expediente a capitanía de Puerto para su revisión y respectiva visación</p> <p>ii. Ingreso a tramitación a la SSFFAA para obtención del permiso de concesión marítima</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La presente acción N°13 tiene como finalidad tramitar el permiso de concesión marítima de parte de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas (SSFFAA). Como se mencionó en reportes anteriores, los ingresos de dicha solicitud se realizaron de forma correcta tanto a la Capitanía de Puerto de Panguipulli, como a la SSFFAA en abril del 2018, pero desde entonces no se ha tenido respuesta oficial por parte del organismo mencionado.</p> <p>Suralis ha realizado continuas gestiones y consultas desde la fecha de ingreso de la solicitud hacia la SSFFAA con el fin de obtener la aprobación necesaria para la ejecución de la acción. A la fecha del presente reporte de avance N°24 (el cual contempla el periodo abril junio) se han realizado en todo el periodo del PDC un total de 38 consultas (2 durante el presente periodo), siendo las últimas 15 respondidas de la misma forma por parte de la SSFFAA: “informamos que el expediente SIABC N° 39940, se encuentra en análisis por parte del equipo técnico. En caso de que producto de este análisis se requieran antecedentes complementarios, serán requeridos mediante los canales formales de comunicación”.</p> <p>En complemento, se menciona que, al 09 de agosto del 2024, Suralis no ha recibido nuevos oficios de la SSFFAA o de la Capitanía de Puerto de Panguipulli respecto a la solicitud de mayor celeridad en la revisión y análisis del expediente, situación planteada mediante la carta N°7875, presentada el 03 de julio de 2020. Por consiguiente, se concluye que a la fecha Suralis no cuenta con una respuesta final de la autoridad para dar por ejecutada la presente acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	13-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	01. Minuta Reporte de Avance 24 Accion 13_V0 02. Informe Estado trámite otorgamiento CCMM, sector Roble Huacho, Panguipulli y sus anexos: o Anexo 1: Consultas realizadas en el SIAC de la Subsecretaría para las Fuerzas Armada sobre el estado del trámite.
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Accion 13_V0.pdf - 02. Informe Estado trámite otorgamiento CCMM, sector Roble Huacho, Panguipulli y sus anexos.pdf - 03. Anexo 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	18
Acción:	Habilitación de un estanque de tormenta previo a las descarga de emergencia  Meta: Disminuir la frecuencia de activación de los aliviaderos de emergencia. Esta obra permitirá disminuir la frecuencia de activación del aliviadero de emergencia, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de las aguas del lago en el area de influencia de las descargas, expresado en terminos de su transparencia, reduciendo además al aporte de nutrientes lo que permitirá bajar el contenido de fosforo en los sedimentos mejorando además su potencial redox.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	30-11-2018
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la obra ejecutada





Forma de Implementación:	<p>1. Consulta de pertinencia ambiental al SEIA para la ejecución de la forma de implementación N°2 de esta acción.</p> <p>2. Habilitación de un estanque de tormenta de modo que ante la necesidad de que se activen los aliviaderos de emergencia, se cuente con un sistema de almacenamiento que permita acumular el agua. El volumen de este estanque será de como mínimo 500 m<sup>3</sup>, lo cual asegura una autonomía de almacenamiento superior a 4 horas, lo anterior en base a la generación de aguas servidas de toda la ciudad de Panguipulli. En cuanto el emplazamiento de este estanque tormenta, se está evaluando la ubicación más apropiada (sector Prat con Carrera o sector Roble Huacho) para que cumpla con el objetivo. Incluye la etapa de licitación.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La presente Acción N°18 contempla la habilitación de un estanque de tormenta, ubicado en el sector de Roble Huacho, previo a las descargas de emergencia. Sin embargo, dicha meta implica la obtención de una RCA favorable referida en la Acción N°22. Debido a lo anterior, la acción se mantiene con un impedimento activo, toda vez que no se haya obtenido una RCA favorable al proyecto presentado a evaluación ambiental a través del SEIA.</p> <p>En el caso del presente reporte de avance N°24, el cual abarca el periodo de abril a junio de 2024, al igual que el reporte anterior (N°23), la acción N°18 se mantiene con el impedimento activo, siendo su evolución o avance abordados en la Acción N°22, en donde se presentan las actividades relativas al EIA y su proceso de evaluación ambiental. Por otro lado, lo referente a los plazos del PdC es posible indicar que el día 08 de mayo de 2024 se sostuvo una reunión con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la cual se abordó el estado del PdC, comprometiéndose el envío de una nueva carta y antecedentes para evaluar la extensión de plazo del mismo.</p> <p>Los medios de verificación asociados a la reunión se encuentran en la Acción N°4.</p> <p>Cabe indicar, que una vez que el proyecto cuente con RCA favorable, la presente acción podrá ser ejecutada.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción: 01. Minuta explicativa del avance de la Acción 18_V0
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Acción 18_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	19
Acción:	"Mejoramiento del aliviadero de emergencia de la PEAS Roble Huacho.  Meta: Disminuir los impactos paisajísticos de la descarga del aliviadero de emergencia."
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de impacto visual
Fecha Inicio:	30-10-2019
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	- Ducto sumergido y extendido
Forma de Implementación:	"1. Sumergir y extender la descarga del aliviadero de emergencia, una vez otorgado el permiso de concesión marítima, conforme a lo establecido en la acción 13, mediante decreto supremo. Nota: Actualmente el ducto está montado en forma aérea, por sobre la lámina de agua del lago"
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La acción N°19 del PdC contempla la mejora de los aliviaderos de emergencia de la PEAS Roble Huacho, disminuyendo así los impactos paisajísticos de la descarga del aliviadero. Para su construcción es necesario contar con la concesión marítima por parte de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas (SSFFAA) conforme a lo establecido en la Acción N°13 del PdC, hito que aún no ocurre durante el periodo del presente reporte de avance N°24 (abril-junio), y que además debe contar una RCA favorable de acuerdo con lo detallado en la acción N°22.</p> <p>Por otro lado, lo referente a los plazos del PdC, el día 08 de mayo de 2024 se sostuvo una reunión con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la cual se abordó el estado del PdC, comprometiéndose el envío de una nueva carta y antecedentes para evaluar la extensión de plazo del mismo. Los medios de verificación asociados a la reunión se encuentran en la Acción N°4.</p> <p>Cabe indicar que, una vez obtenida la RCA favorable, en complemento con el otorgamiento de la concesión marítima por parte de la SSFFAA, será posible ejecutar la presente acción, de acuerdo a los tiempos estipulados en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción: 01. Minuta de Avance 24 Acción 19_V0.pdf
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Acción 19_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	20
-------------------	----



Acción:	<p>Mejoramiento de los aliviaderos de emergencia de Prat con Carrera y Roble Huacho, instalando medidores de caudal con visor y rejas mecánicas de finos en cada aliviadero de emergencia que reemplazan a los medidores provisorios y rejas manuales gruesas. Al reducir el contenido de sólidos, se mejorará la transparencia de las aguas del lago en el área de influencia de las descargas y se reducirá la acumulación de sedimentos, mejorando de este modo su potencial redox.</p> <p>Meta: Disponer de información del caudal en terreno e incrementar la retención de sólidos.</p>
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	02-08-2018
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Reemplazo del 100% de los medidores portátiles por medidores alimentados con corriente eléctrica y con visor de datos en terreno, e instalación de reja de finos mecánica.
Forma de Implementación:	<p>1. Reemplazo de los medidores portátiles descritos en la acción N°5 (Mejoramiento y robustecimiento de las PEAS Roble Huacho y Carmela Carvajal) por medidores alimentados con corriente eléctrica y con visor de datos en terreno.</p> <p>2. Consulta de pertinencia ambiental al SEIA para la ejecución de la forma de implementación N°3 de esta acción</p> <p>3. Incorporación de una reja de finos mecánica, una vez que se cumpla la acción N°9 (Mejoramiento del aliviadero de la PEAS Roble Huacho) y al resultado de la forma de implementación N°2 de esta acción.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para la presente acción N°20 se considera el mejoramiento de los aliviaderos de emergencia, dicho mejoramiento implica la implementación de rejillas para la captura de finos, las cuales se encuentran relacionadas directamente con la obtención de una RCA favorable para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli”.</p> <p>Cabe indicar, que una vez que el proyecto cuente con RCA favorable, la presente acción podrá ser ejecutada. En el caso del presente reporte de avance N°24, el cual abarca el periodo de abril a junio de 2024, la acción N°20 se mantiene con el impedimento activo, siendo su evolución o avance abordados en la Acción N°22, en donde se presentan las actividades relativas al EIA y a su proceso de evaluación ambiental. Por otro lado, lo referente a los plazos del PdC, el día 08 de mayo de 2024 se sostuvo una reunión con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la cual se abordó el estado del PdC, comprometiéndose el envío de una nueva carta y antecedentes para evaluar la extensión de plazo del mismo. Los medios de verificación asociados a la reunión se encuentran en la Acción N°4.</p> <p>Cabe indicar, que una vez que el proyecto cuente con RCA favorable, la presente acción podrá ser ejecutada.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción: 01. Minuta explicativa Reporte de Avance 24 Acción 20_V0
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Acción 20_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	22
-------------------	----



Acción:	<p>Evaluación de Impacto Ambiental, a través del instrumento de calificación ambiental correspondiente a un EIA, el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS), mejoras de la capacidad de bombeo de las PEAS e incorporación de una tercera Peas en la parte baja de la ciudad, y regularización de las obras existentes, unidades de pretratamiento, segundo reactor de lodos activados, bypass y aliviaderos de tormenta de las PEAS</p> <p>Meta: Aumentar la capacidad de bombeo de las PEAS y la capacidad de tratamiento de las PTAS para elevar y tratar aguas mixtas, disminuyendo el uso de los aliviaderos de emergencia, evaluando ambientalmente el proyecto existente, incluido el pretratamiento y el segundo reactor biológico, junto con la ampliación de la planta de tratamiento. De este modo, se disminuirá la frecuencia de activación de los aliviaderos de emergencia, mejorando de este modo, la calidad de las aguas del lago medido en terminios de su transparencia en el area de influencia de las descargas, y se reducirá la carga orgánica, lo cual disminuirá la acumulación de fosforo en sus sedimentos, mejorando su potencial redox.</p>
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	31-10-2019
Fecha Término:	30-12-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de RCA Favorable
Forma de Implementación:	1. Evaluación ambiental del proyecto en el SEIA
Acciones Alternativas:	24.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





**Estado de Avance Reportado:**

De acuerdo con la Acción N°21 que consideraba hacer ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un EIA, el 28 de octubre de 2019 se hizo ingreso del proyecto, sin embargo, debido a que no presentaba los contenidos mínimos de los EIA de acuerdo al D.S. N°40/2012 del MMA, no fue admitido a tramitación.

Posteriormente, el 1 de abril de 2020 tal como fue informado en el reporte de avance N°7, se realizó un segundo ingreso. En el reporte de avance N°10 se informa que con fecha 12 de noviembre de 2020, el SEA oficializa el término anticipado del proceso de evaluación ambiental mediante Res. Ex. 36/2020. Posterior a esa fecha, y conforme lo indicado en el reporte de avance N°12, se realizaron diversas gestiones con el propósito de re-ingresar el proyecto al SEIA. Respecto de lo anterior, con fecha 10 de diciembre de 2020, Suralis solicita a la SMA una extensión de plazo de 3 meses respecto de la activación de la Acción Alternativa N°24 y lo estipulado en el PdC. En consecuencia, la SMA mediante Res. Ex. N°14 del 01 de abril de 2021, suspende los plazos de ejecución de la Acción N°24 (y por consiguiente lo referido a la Acción N°22) hasta el día de término de la Fase 1 del “Plan Paso a Paso”, conforme así lo indique la autoridad sanitaria, lo cual sucede en primera instancia con fecha 20 de mayo de 2021.

Posteriormente, en el reporte de avance N°13, se informa que el EIA fue reingresado el 29 de julio de 2021 al SEIA, y admitido a trámite el 05 de agosto de 2021 mediante Resolución Exenta N° 40/2021. En el reporte de avance N°14, se informa sobre los avances en el proceso de evaluación, la carga al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al EIA (ICSARA) y la notificación de documento hacia el Representante Legal de Suralis (Ex - ESSAL), Boris Navarro Alarcón, y a la Oficina de partes del SEA.

Respecto del proceso de evaluación, se solicita mediante carta la extensión de plazo de 8 meses (aproximadamente) para dar respuesta al ICSARA. Dicha solicitud fue aprobada por el SEA mediante una “Resolución de extensión de la suspensión” emitida el 29 de marzo de 2022, otorgando plazo hasta el 19 de diciembre de ese mismo año.

En la misma línea, el 15 de diciembre de 2022, Suralis mediante una carta dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Ríos, solicita la extensión de la



	<p>suspensión del plazo que resta para finalizar el proceso de evaluación de impacto ambiental. A partir de aquello, mediante la Res. EX. N°20221400148 del 16 de diciembre de 2022 dicha Comisión resuelve extender la suspensión de plazo indicando como fecha culmine para el ingreso de la Adenda el 18 de abril de 2023.</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2023, Suralis realiza las actividades necesarias para dar respuesta al ICSARA, cumpliendo que el ingreso de la respectiva Adenda al SEIA en tiempo y forma. Posterior a ello, el SEA emite el ICSARA Complementario y un ICSARA Ciudadano, el 10 y 20 de julio de 2023, respectivamente. Respecto a ambos documentos, Suralis solicita una extensión de plazo para la entrega de la respectiva Adenda. Dicha solicitud es aprobada por el SEA mediante una “Resolución de extensión de la suspensión” emitida el 12 de septiembre de 2023, otorgando plazo hasta el 29 de marzo de 2024. Posteriormente, con fecha 26 de marzo de 2024 se emite la Res. Ex. 20241400111 la cual resuelve extender la suspensión del plazo del procedimiento de la evaluación del proyecto, con el fin de permitir a Suralis dar una adecuada respuesta al ICSARA complementario e ICSARA ciudadano, fijando la fecha de entrega para el 10 de septiembre del 2024.</p> <p>Para el presente reporte de avance N°24 correspondiente al periodo mayo a julio 2024 y tal como se mencionó en el párrafo anterior, Suralis se encuentra en proceso de elaboración de la Adenda Complementaria, así como también del Anexo Ciudadano para dar cumplimiento en el plazo comprometido.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción:</p> <p>01. Minuta Reporte de Avance 24 Acción 22_V0</p> <p>02. Ficha del proyecto Expediente SEIA.</p> <p>03. Ficha PAC del proyecto Expediente SEIA</p>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Reporte de Avance 24 Acción 22_V0.pdf</p> <p>- 02. Ficha del proyecto Expediente SEIA.pdf</p> <p>- 03. Ficha PAC del proyecto Expediente SEIA.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	10-07-2023





Archivos Asociados al Impedimento	- 02. Ficha del proyecto Expediente SEIA.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	23
Acción:	Programa de monitoreo ambiental en el Lago Panguipulli.  Meta: Analizar la calidad de las aguas y sedimentos del lago Panguipulli. Esta acción permitirá determinar el efecto que tienen los aliviaderos de emergencia sobre el lago, especialmente en lo referido a la transparencia de sus aguas y el contenido de fosforo y potencial redox de sus sedimentos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	06-08-2018
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de los muestreos comprometidos
Forma de Implementación:	"Se realizará un monitoreo ambiental del Lago Panguipulli para analizar la calidad del agua y del sedimento, realizando 1 monitoreo en temporada estival y dos monitoreo en época otoño-invierno."
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La presente Acción N°23 contempla la realización de monitoreos sobre la calidad del agua y los sedimentos del lago Panguipulli. Dichos monitoreos se encuentran programados para ser ejecutados en verano, otoño e invierno del 2024, lo que corresponde a tres monitoreos anuales. Para el periodo correspondiente al presente reporte de avance N°24 (abril, mayo y junio) se realizó el monitoreo de otoño por la ETFA Ecogestión Ambiental Ltda durante el entre el 14 al 16 de junio de 2024 a través de 26 estaciones de muestreo. Sus análisis y resultados se encuentran contenidos en el Informe de monitoreo limnológico adjunto como verificador y sus correspondientes anexos.</p> <p>De forma complementaria, se entrega el análisis de 4 variables que fueron registradas durante la fiscalización que terminó en la ejecución del actual PdC. Dichas variables son expuestas a través del tiempo para visualizar su comportamiento de acuerdo a los límites establecidos para cada variable de acuerdo a la normativa vigente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	01. Reporte de Avance 24 Acción 23_V0 02. Informe Monitoreo Limnológico otoño 2024 y Anexos
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Acción 23_V0.pdf - 02. Informe Monitoreo Limnológico otoño 2024 y Anexos.part1.rar - 02. Informe Monitoreo Limnológico otoño 2024 y Anexos.part2.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.



- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Sedimentos lacustres	Muestreo
Sedimentos lacustres	Medición
Sedimentos lacustres	Análisis

N° Identificador:	25
Acción:	Programa de monitoreo de las descargas en la bahía del Lago Panguipulli, en la ciudad de Panguipulli.  Meta: Analizar la calidad de las aguas descargadas por otras fuentes diferentes a los aliviaderos de emergencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-01-2019
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de los muestreos comprometidos
Forma de Implementación:	Se realizará un monitoreo trimestral de las descargas indentificadas. Las cuales se presentan en anexo N°1 de la carta de respuesta a la Res. Ex. N°10. Los resultados de los monitoreos se presentarán acorde a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015 de la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El periodo del presente reporte de avance N°24 corresponde a los meses de abril, mayo y junio, el cual corresponde al segundo trimestre del monitoreo de descargas hacia el Lago Panguipulli. El monitoreo se realizó en 6 estaciones de muestreo considerando 2-3 repeticiones durante el 04 de junio de 2024. Se menciona que, para el presente periodo el punto D5 no se pudo medir el caudal toda vez que el lugar no cumple con las condiciones para implementar la metodología de medición y el punto D3 no presentaba agua.</p> <p>En el Informe de Monitoreo se menciona que todos los parámetros registrados, los cuales corresponden a nutrientes, parámetros bacteriológicos, sedimentos y características químicas y microbiológicas se encuentran dentro de los rangos normales, otorgando calidad oligo-mesotróficas a los afluentes que desembocan en el lago Panguipulli. Además, los elementos químicos y microbiológicos cumplen los estándares mencionados en la norma chilena NCH 1333/1978 para la calidad de agua. Por último, se incluyen gráficos que muestran el comportamiento histórico de variables relevantes que fueron consideradas durante la fiscalización ambiental utilizada para la formulación de cargos que termino desencadenando el actual PdC</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción:</p> <p>01. Minuta Reporte de Avance 24 Acción 25_V0</p> <p>02. Informe monitoreo de descargas segundo trimestre 2024 y anexos.part1</p>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Reporte de Avance 24 Acción 25_V0.pdf</p> <p>- 02. Informe monitoreo de descargas segundo trimestre 2024 y anexos.part1.rar</p> <p>- 02. Informe monitoreo de descargas segundo trimestre 2024 y anexos.part2.rar</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

N° Identificador:	26
Acción:	Programa de monitoreo de la biota en la bahía del Lago de la ciudad de Panguipulli  Meta: Analizar la biota de la bahía del Lago de la ciudad de Panguipulli
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-01-2019
Fecha Término:	31-07-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de los muestreos comprometidos



Forma de Implementación:	Se realizará un monitoreo semestral de biota, según la metodología presentada en Anexo N°2 de la carta de respuesta a la Res. Ex.N°10. Los resultados de los monitoreos se presentarán acorde a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015 de la SMA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para la presente Acción N°26 se contempla la realización de un Monitoreo Ambiental de Biota con una frecuencia semestral. Al respecto, se menciona que durante el reporte de avance N°24 que contempla los meses de abril, mayo y junio, no corresponde reportar el monitoreo de biota pues el periodo de verano del 2024 fue considerado dentro del informe entregado durante el reporte de avance anterior (N°23).
Fecha Inicio Efectivo:	25-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la acción: 01. Minuta Reporte de Avance 24 Acción 26_V0
Medios de Verificación:	- 01. Reporte de Avance 24 Acción 26_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3028-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo



Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Sedimentos lacustres	Muestreo
Sedimentos lacustres	Medición
Sedimentos lacustres	Análisis

## Acciones Alternativas

N° Identificador:	24
Acción:	"Reingreso al SEIA del Estudio de Impacto de Ambiental  Meta: Aumentar la capacidad de bombeo de las PEAS y la capacidad de tratamiento de las PTAS para elevar y tratar aguas lluvias, disminuyendo el uso de los aliviaderos de emergencia, evaluando ambientalmente el proyecto existente junto con la ampliación de la planta de tratamiento."
Tipo de Acción:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de RCA favorable
Forma de Implementación:	"1. Se realizarán las gestiones pertinentes para subsanar en breve plazo si debe ser reingresado el EIA por temas de forma en la admisión. 2. Elaboración de estudios complementarios requeridos para el nuevo ingreso del EIA según se especifique en la resolución de inadmisibilidad o en la que pone término anticipado al proceso de evaluación. 3. Re ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) incluidas obras de tratamiento de aguas lluvias, mejoras de la capacidad de bombeo de la PEAS, y regularización de consultas de pertinencia.
Acción Principal:	22.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





**Estado de Avance Reportado:**

Conforme lo indicado en la minuta de la Acción N°22, durante el transcurso de la tramitación ambiental del EIA del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli”, se activa el impedimento “II)” de la citada acción, que dice relación con retraso en la obtención de la RCA por causas no imputables a Suralis. Lo anterior se vincula específicamente a la solicitud de una ampliación de plazo para el ingreso de la Adenda complementaria y Adenda Ciudadana, a fin de dar respuesta cabal a los requerimientos solicitados en el ICSARA Complementario e ICASARA Ciudadano, emitidos por el SEA el 10 y 12 de julio de 2023 respectivamente. Bajo este contexto, mediante la Res. Ex. 20241400111 emitida el 26 de marzo de 2024, se resuelve suspender el plazo del procedimiento de evaluación del proyecto, con el fin de permitir a Suralis dar una adecuada respuesta al ICASARA complementario e ICASARA ciudadano, fijando la fecha de entrega para el 10 de septiembre de 2024. En razón a lo anterior, para el presente reporte de avance N°24 (periodo mayo a julio), Suralis se encuentra en proceso de elaboración de la Adenda Complementaria y Ciudadana para dar cumplimiento en el plazo comprometido. Por otra parte, en cuanto a los plazos del PdC es posible indicar que el día 08 de mayo de 2024 se sostuvo una reunión con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la cual se abordó el estado del PdC, comprometiéndose el envío de una nueva carta y antecedentes para evaluar la extensión de plazo del mismo. Los medios de verificación asociados a la reunión se encuentran en la Acción N°4. Por último, ya que la Acción N°22 y la respectiva Acción Alternativa N°24 (asociada al impedimento “II)” de la Acción N°22, fueron activadas mediante la emisión de la Resolución N°20231400139; en el presente reporte se mantiene activa la Acción Alternativa N°24, situación que se extenderá hasta el ingreso de la Adenda Complementaria y la Adenda Ciudadana.

**Fecha Inicio Efectivo:** 10-07-2023

**Fecha Término Efectivo:**

**Estado Actual de la Acción:** En ejecución

**Descripción Medios de Verificación:** Se entregan los siguientes verificadores:  
- Minuta Acción N°24

**Medios de Verificación:** - 01. Reporte de Avance 24 Acción 24\_V0.pdf

**Informes de Seguimiento:**





Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3027-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 16-06-2025 18:04

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

