

**MAT.:** Entrega información requerida.

**ANT.:** Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Puerto Montt, 22 de julio de 2024

Sra.

**Ivonne Mansilla Gómez**

Jefa Oficina Regional de Los Lagos

Superintendencia del Medio Ambiente

Aníbal Pinto 142, piso 6 (Edificio Murano)

Puerto Montt

**PRESENTE**

Junto con saludarle, **Gastón Cortez Quezada**, cédula nacional de identidad N° 9.532.444-4, en representación de **Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**, Rol Único Rributario N° 77.071.440-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, comuna de Puerto Montt, encontrándome dentro de plazo, me dirijo a Ud., a efectos de entregar la información requerida en el punto 1 del resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024 ("**RE N° 958/2024**"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**"), consistente en:

**SEGUNDO:**                    **REQUIÉRASE DE INFORMACIÓN** a

Comercial y Servicios Sur Austral Limitada, RUT N°77.071.440-0, titular del proyecto "DIA, Ampliación de la Planta de Proceso Marine Harvest - Chamiza", a efectos que informe lo siguiente:

1.    **Presentar reportes semanales del estado de avance de la implementación de las mejoras que proponga el informe técnico** señalado en el numeral 1 del resuelvo anterior, adjuntando los medios de verificación correspondientes, que incluya fotografías fechadas y georreferenciadas, hasta su completa finalización.

Al respecto, se adjunta a esta presentación los siguientes documentos correspondientes a las actividades realizadas durante la Semana 2, de acuerdo con lo indicado en la Carta Gantt enviada a usted el 05 de julio de 2024:

1. *Informe de avance Semana 02;*

2. *Fotografías de evidencia; y,*
3. *Carta Conductora.*

**POR TANTO**, en virtud de esta presentación, solicito a Ud. tener por cumplido el requerimiento de información contenidos en el resuelvo Segundo de la RE N° 958/2024 de la SMA.

**Gastón Cortez Quezada**  
**pp. Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**

## INFORME SEMANA 02 MEDIDA PROVISIONAL ORDENADA EN RES. EX. N°958

Para dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución Exenta N°958 del 19 de junio de 2024 y de acuerdo con lo establecido en la Carta Gantt presentada el 05 de julio de 2024, informamos lo siguiente:

Item	Gantt de actividades	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5									
		Dias					Dias					Dias					Dias					Dias									
		L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D
1,0	Acurdos constructuales y carga de documentos al portal pronexo	■	■	■	■																										
2,0	adquisicion de materiales		■	■	■				■	■	■																				
3,0	Instalacion de faenas, contenedor y baño químico																														
4,0	Oocc																														
4,1	trazado y niveles																														
4,2	excavaciones																														
4,3	rellenos compactados																														
4,4	fabricacion de moldajes																														
4,5	fabricacion enfierradura																														
4,6	intalacion moldajes y enfierradura																														
4,7	hormigonado fundaciones G-250902008R7																														
4,8	retiro de moldajes																														
5,0	Estructura Metalica																														
5,1	fabricacion placas de anclaje																														
5,2	fabricacion pilares 200x100x3mm L=8mts																														
5,3	fabricacion canales U 100x50x2mm galvanizadas																														
5,4	fabricacion viga horizontal de 150x100x3mm																														
5,5	fabricacion viga horizontal superior 100x50x3mm																														
5,6	instalacion estructura metalica con camion pluma																														
5,7	fabricacion marcos en canal U para montaje de paneles																														
5,8	Intalacion de marcos de paneles con camion pluma																														
5,9	sellado de junta de panles con silicona poliuretano																														
6,0	aseo y entrega de obra																														

### 2.0 Adquisición de Materiales

La totalidad de los paneles acústicos ya fueron entregados y se encuentran almacenados en nuestra planta de procesos a la espera de su instalación.



### 3.0 Instalación de faenas, contenedor y baño químico.


Comercial y servicios sur austral Ltda. ha facilitado un lugar para que la empresa que materializará el proyecto se instale sin la necesidad de ingresar contenedores u oficinas que ocupen espacios y generen riesgos innecesarios a las personas. Además, existen instalaciones sanitarias a 70 mt de la faena que están habilitados para el personal interno y externo. (Agregar fotos de oficinas y baños).



OFICINA DE FAENA




INSTALACIONES SANITARIAS

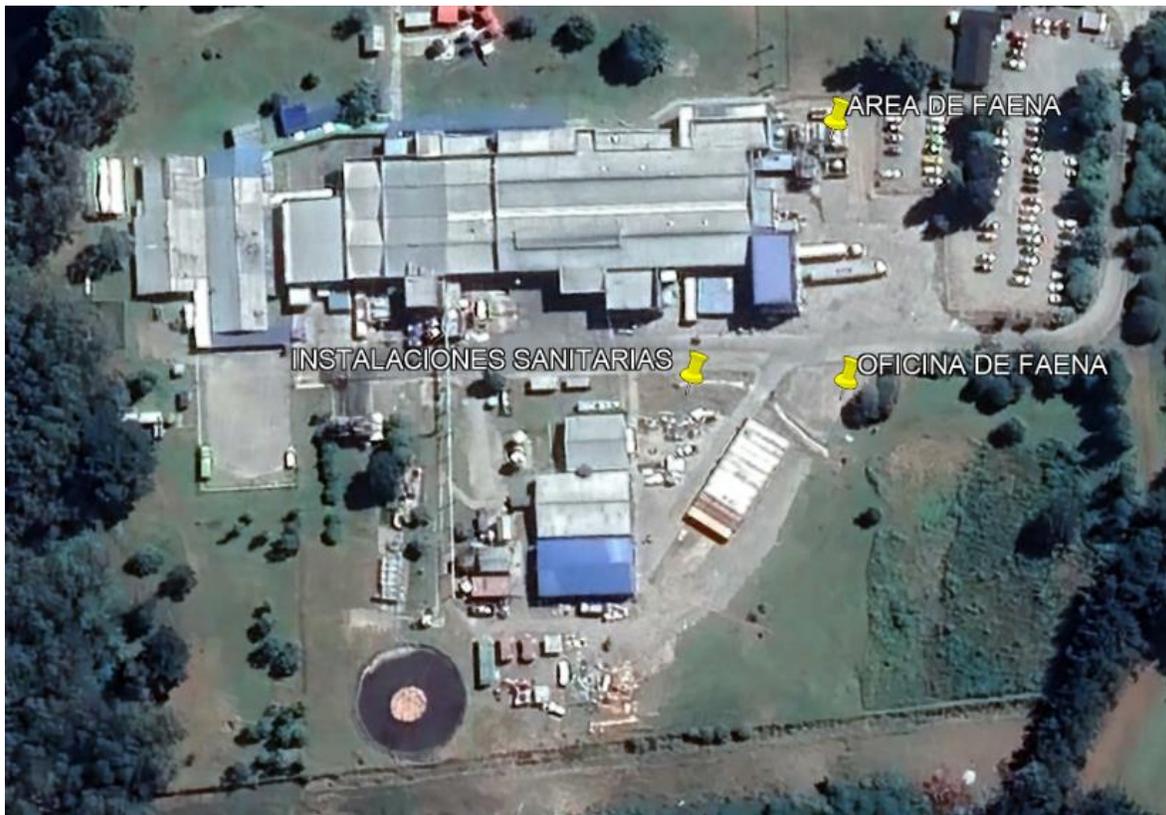

UBICACIÓN REFERENCIAL

#### 4.1 Trazado y Niveles

Se realiza el trazado y niveles de acuerdo con lo programado.

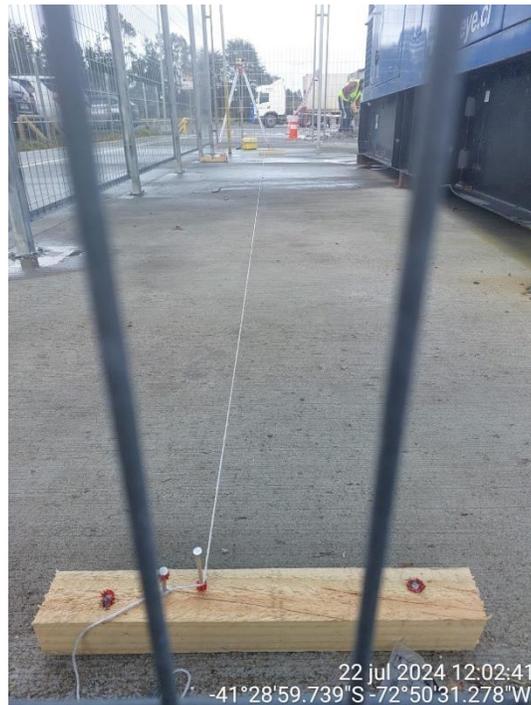

## 4.2 Excavaciones



## 4.3 Rellenos compactados



#### 4.4 Fabricación de moldajes



#### 4.5 Fabricación de enfierradura





### 5.1 Fabricación Placas de anclaje



### 5.2 Fabricación Pilares 100x200 mm



### 5.3 Fabricación Canales U



#### 5.4 Fabricación viga horizontal

Las vigas horizontales estarán listas durante la presente semana, como lo indica la carta Gantt.
