


Santiago, 11 de Octubre de 2013.

CARTA N°0088/2013.-



**Ref.:** - ORD. U.I.P.S N°398 del 5 de marzo del 2013, Ministerio de Salud de la Región Libertador Bernardo O'Higgins.

Sra.:

**Pamela Torres Bustamante**

**Fiscal Instructora del Procedimiento Administrativo Sancionatorio**

Superintendencia del Medio Ambiente Gobierno de Chile.

Presente

Estimados Sra.:

En relación al Ord.288, del 10 de junio del 2013, donde se notifica el inicio de la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio por el sitio ubicado en Domingo Faustino Sarmiento N°1035, de nuestra propiedad, informo que Telefónica, con fecha 28 de enero, envió CARTA 011/2013 a Seremi de Salud, indicando que los trabajos para solucionar los problemas de ruido, que están fuera de lo establecido por las normas vigentes, se realizarían antes del 28 de Febrero del 2013. Estos trabajos fueron realizados en dos etapas:

- Reparación de equipo de aire acondicionado, que producía el ruido.
- Confinamiento de emisores de ruido.

La primera etapa se realizó antes del 28 de febrero, lo cual fue comprobado por el Inspector de Seremi de salud, Sr. José Miguel Silva, dicha medición arrojó que los ruidos estaban dentro de los parámetros de las normas establecidas.

Respecto al segundo punto, y con el fin de demostrar a la comunidad el cumplimiento de las acciones encomendadas, se dio término a fines de mayo de este año, a la construcción de unas placas acústicas para atenuar aún más, los niveles de ruido. (Se adjunta Informe Técnico con fotografías de las mejoras implementadas).

El detalle, las fotografías y las mediciones de los niveles actuales de ruido serán enviadas a más tardar el 25 de octubre del 2013, de acuerdo a lo conversado telefónicamente.



Banda Ancha



Móvil




Línea Hogar




TV Digital

San Martín N°457, 1° piso, Rancagua.



La no respuesta oportuna, se debió a que la correspondencia venía con dirección errónea: San Martín #157, debiendo decir: San Martín #457, información de lo cual dejo constancia:

## Directorio de Personas



### Leonardo Patricio Canales Jara

Jefe Área Especialista

F. Nacimiento **28-08**  
Fono Trabajo **202045 - 202085**  
Correo Electrónico **[leonardo.canales@telefonica.com](mailto:leonardo.canales@telefonica.com)**  
Fono Celular **95296094**

### Datos Laborales

Jefe Directo **Perez Valdes Miguel Angel**  
Lugar de Trabajo **San Martin 457 Rancagua**  
Ingreso **01-10-1996**  
Dirección **D. Red**  
Gerencia **G. Gestión De Redes Y Servicios**  
U. de Negocio **J. OPERACIONES TECNICAS - RANCAGUA / LINARES**  
C. Costo **1471331040 - J. OPERACIONES TECNICAS - RANCAGUA / LINARES**  
Zona **Rancagua**  
Tipo de Empleado **Permanente**  
Temas Relacionados

Cualquier antecedente adicional o coordinación de los trabajos, agradeceré comunicarse con nuestro Supervisor Área Técnica, Sr. Nelson Escobar V. al celular 95294736 o al suscrito, al móvil 95296094.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**LEONARDO CANALES JARA**  
Jefe de Area  
TELEFONICA CHILE S. A.

**Leonardo Canales Jara.**

Leonardo.canales@telefonica.com  
Jefe de Área Operaciones Centro Sur.  
VI – VII Región  
San Martín N°457, 1° piso, Rancagua.



Banda Ancha



Móvil



Línea Hogar



TV Digital



## Nelson Antonio Escobar Vargas

---

**De:** Maribel Atenas Guaschino  
**Enviado el:** miércoles, 09 de octubre de 2013 10:25  
**Para:** Nelson Antonio Escobar Vargas  
**Asunto:** RV: Informe Técnico Aislación Terraza Condensadores Rancagua 4  
**Datos adjuntos:** Panel acustico Rancagua 4.pdf

-----Mensaje original-----

De: Nelson Antonio Escobar Vargas  
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2013 16:45  
Para: Maribel Atenas Guaschino  
CC: Leonardo Canales.; Daniel Caroca Torrealba; Segundo Enrique Cespedes Castillo; Adan Jose Tapia Briones  
Asunto: RE: Informe Técnico Aislación Terraza Condensadores Rancagua 4

Maribel

Adjunto Aceptación de aislación equipos de clima Rancagua 4.

atte.

Escobar Vargas Nelson Antonio  
Supervisor Planta Interna VI y VII Región I  
San Martin 457 , Rancagua, Chile  
[nelson.escobar@telefonica.com](mailto:nelson.escobar@telefonica.com) | Tel +56 72 2202095 | Móvil +56 9 5294736 [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace.

Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés.

-----Mensaje original-----

De: Maribel Atenas Guaschino  
Enviado el: martes, 11 de junio de 2013 17:53  
Para: Nelson Antonio Escobar Vargas  
CC: Leonardo Canales.  
Asunto: RV: Informe Técnico Aislación Terraza Condensadores Rancagua 4

Estimados,

Para su información ...

Revisar en terreno y confirmar recepción ok firmando el informe adjunto.

Atte.

MARIBEL ATENAS GUASCHINO

-----Mensaje original-----

De: julio [mailto:julio.delgado@inedel.cl] Enviado el: lunes, 10 de junio de 2013 21:35  
Para: Maribel Atenas Guaschino  
CC: Ing. Inedel Ltda.



Asunto: Informe Técnico Aislación Terraza Condensadores Rancagua

Maribel:

Adjunto Informe Técnico de los trabajos ejecutados para Aislación de ruido en Terraza Condensadores Rancagua 4.

Atento a tus consultas o comentarios.

Saludos.

--

Julio Delgado C.

Ingeniería Inedel Ltda


Fono: 5547656

Móvil: 97414232






**FECHA** : 25-5-2013  
**CLIENTE** : MOVISTAR  
**OBRA** : AISLACION ACUSTICA TERRAZA CONDENSADORES  
**UBICACIÓN** : OFICINA TECNICA RANCAGUA 4  
**ATE** : SRA. MARIBEL ATENAS

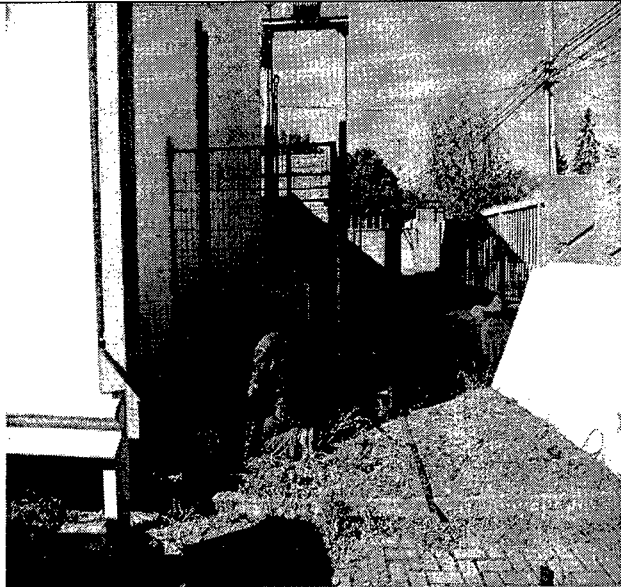


REFUERZO ESTRUCTURA EXISTENTE

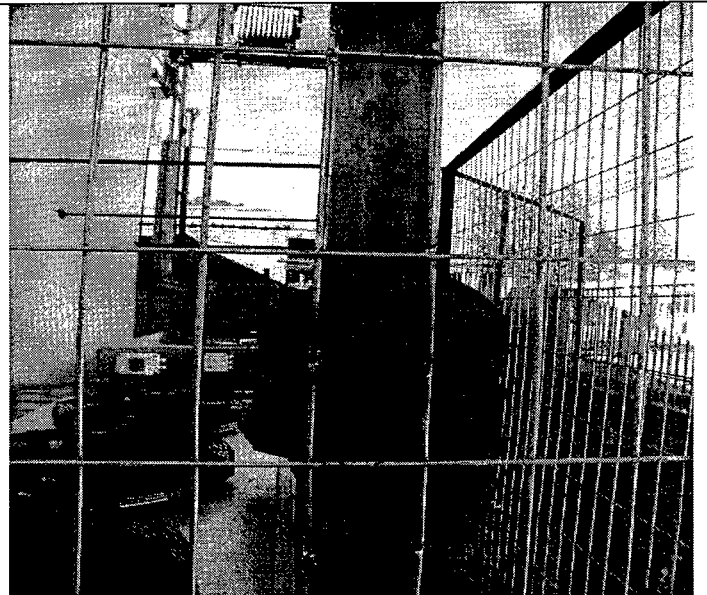

SOLDAURA A MALLAS PARA SOPORTAR AISLACION



INSTALACION CUBIERTA EXTERIOR

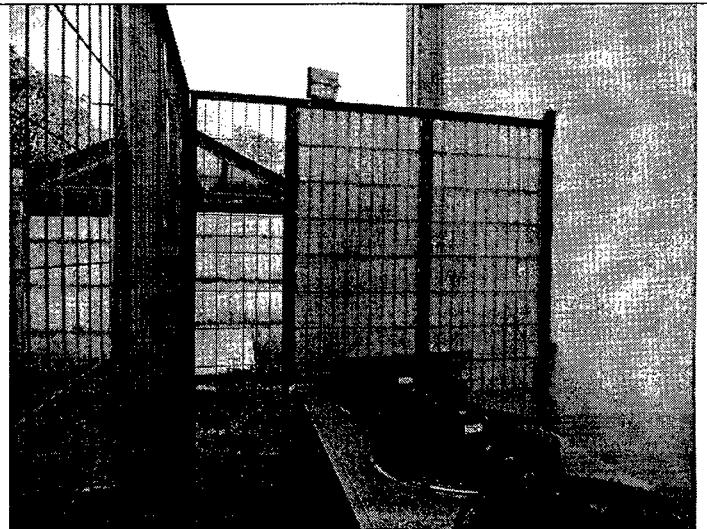


INSTALACION CUBIERTA EXTERIOR







INSTALACION LAMINAS AISLANTES

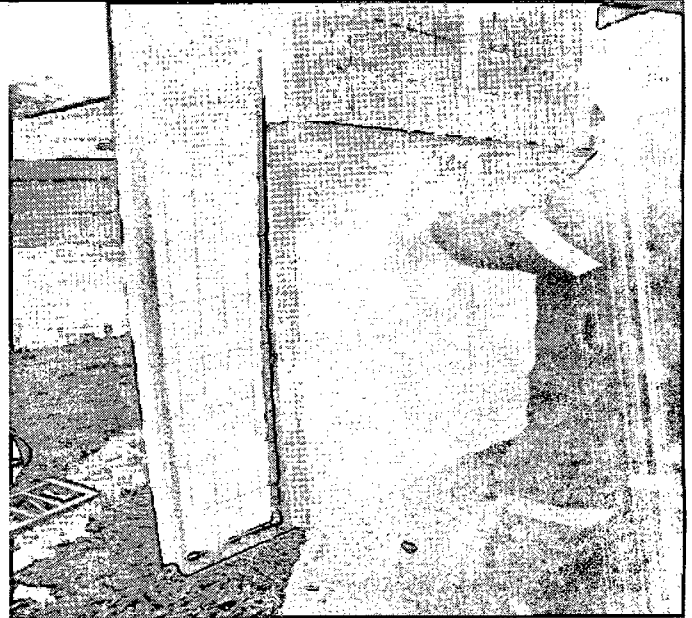


INSTALACION LAMINAS AISLANTES

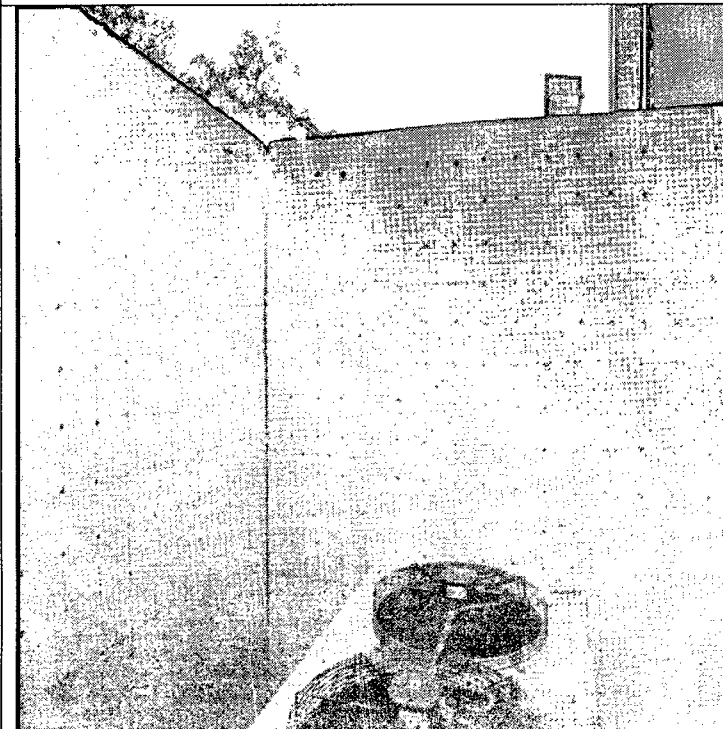

INSTALACION CUBIERTA INTERIOR PERFOTADA

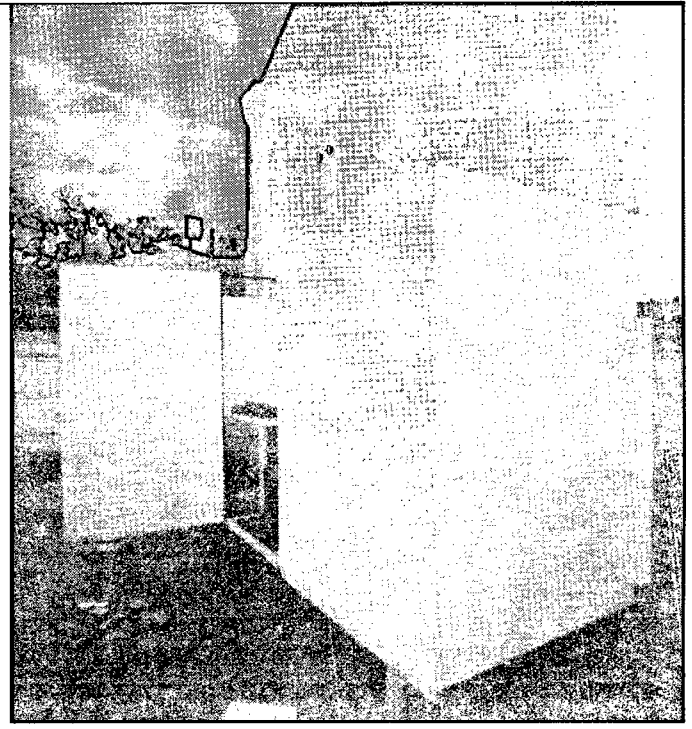

CASETA TERMINADA





# INFORME TÉCNICO

EQUIPOS DE CLIMATIZACION

IT-OP-01

Rev.: 0.0

Se instalaron placas de internit lisas para el exterior, se instalaron planchas de lana mineral aislante y se instaló placas de internit microperforadas por cara interior. Con ello se construye un panel acústico para disminuir el ruido hacia el exterior de la terraza de condensadores.

Atentamente


Julio Delgado

Trabajo recibido conforme: *Revisado por Daniel CANOCA.*

Fecha: *12.06.2013*

Nombre: *Nelson Escobar JARGAS*

Firma:

  
NELSON ESCOBAR V.  
Unid. Ingeniería  
C.T.C. - RANCAGUA

