

MAT.: Entrega información requerida.

ANT.: Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Puerto Montt, 05 de agosto de 2024

Sra.

Ivonne Mansilla Gómez

Jefa Oficina Regional de Los Lagos

Superintendencia del Medio Ambiente

Aníbal Pinto 142, piso 6 (Edificio Murano)

Puerto Montt

PRESENTE

Junto con saludarle, **Gastón Cortez Quezada**, cédula nacional de identidad N° 9.532.444-4, en representación de **Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**, Rol Único Rributario N° 77.071.440-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, comuna de Puerto Montt, encontrándome dentro de plazo, me dirijo a Ud., a efectos de entregar la información requerida en el punto 1 del resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024 ("**RE N° 958/2024**"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**"), consistente en:

SEGUNDO: **REQUIÉRASE DE INFORMACIÓN** a

Comercial y Servicios Sur Austral Limitada, RUT N°77.071.440-0, titular del proyecto "DIA, Ampliación de la Planta de Proceso Marine Harvest - Chamiza", a efectos que informe lo siguiente:

1. **Presentar reportes semanales del estado de avance de la implementación de las mejoras que proponga el informe técnico** señalado en el numeral 1 del resuelvo anterior, adjuntando los medios de verificación correspondientes, que incluya fotografías fechadas y georreferenciadas, hasta su completa finalización.

Al respecto, se adjunta a esta presentación los siguientes documentos correspondientes a las actividades realizadas durante la Semana 4, de acuerdo con lo indicado en la Carta Gantt enviada a usted el 05 de julio de 2024:

1. *Informe de avance Semana 04;*

2. *Carta Gantt Actualizada, debido a que por el frente de mal tiempo que afectó a la región de Los Lagos, hubo que suspender la faena por el riesgo que significaba para las personas trabajar bajo dichas condiciones de lluvia y viento.*
3. *Evidencia de sistema frontal que afectó la región*

POR TANTO, en virtud de esta presentación, solicito a Ud. tener por cumplido el requerimiento de información contenidos en el resuelvo Segundo de la RE N° 958/2024 de la SMA.

Gastón Cortez Quezada
pp. Comercial y Servicios Sur Austral Limitada

INFORME SEMANA 04
MEDIDA PROVISIONAL ORDENADA EN RES. EX. N°958

- **Avance de Obra:**

N°	DESCRIPCION	TOTAL	% AVANCE
1,0	Instalacion De Faenas	\$1.365.000	87%
2,0	Materiales Oocc	\$3.852.095	73%
3,0	Materiales Estructura Metalica	\$13.820.940	92%
4,0	Maquinaria	\$3.748.000	0%
	Mano de obra	\$13.896.600	40%
	Gastos Generales	\$6.056.680	40%
	Margen	\$5.502.395	40%
TOTAL PROYECTO NETO		\$48.241.710	56%

4.6 Instalación de Moldaje y enfierradura



5.4 Traslado de material de estructura metálica de la obra




- **COMENTARIOS:**

1. Por las condiciones climáticas extremas que afectaron gran parte del país y en particular a la región de Los Lagos que permanece bajo estas condiciones hasta el día de hoy lunes 05 de agosto, no fue posible concretar la partida de hormigonado, la cual ha sido reprogramada para el miércoles 07 de agosto a las 14 hr.
2. Las excavaciones quedaron expuestas a la espera del hormigonado, como esto no ocurrió en la fecha planificada, hubo algunos desmoronamientos que deberán repararse antes de hormigonar.
3. Durante los días en que no se pudo trabajar por las condiciones climáticas se trabajó en el taller del proveedor en la fabricación de los marcos que recibirán los paneles acústicos.

SISTEMA FRONTAL SEMANA 31

Temporal de viento y lluvia entre el miércoles 31 de julio y el sábado 03 de agosto.

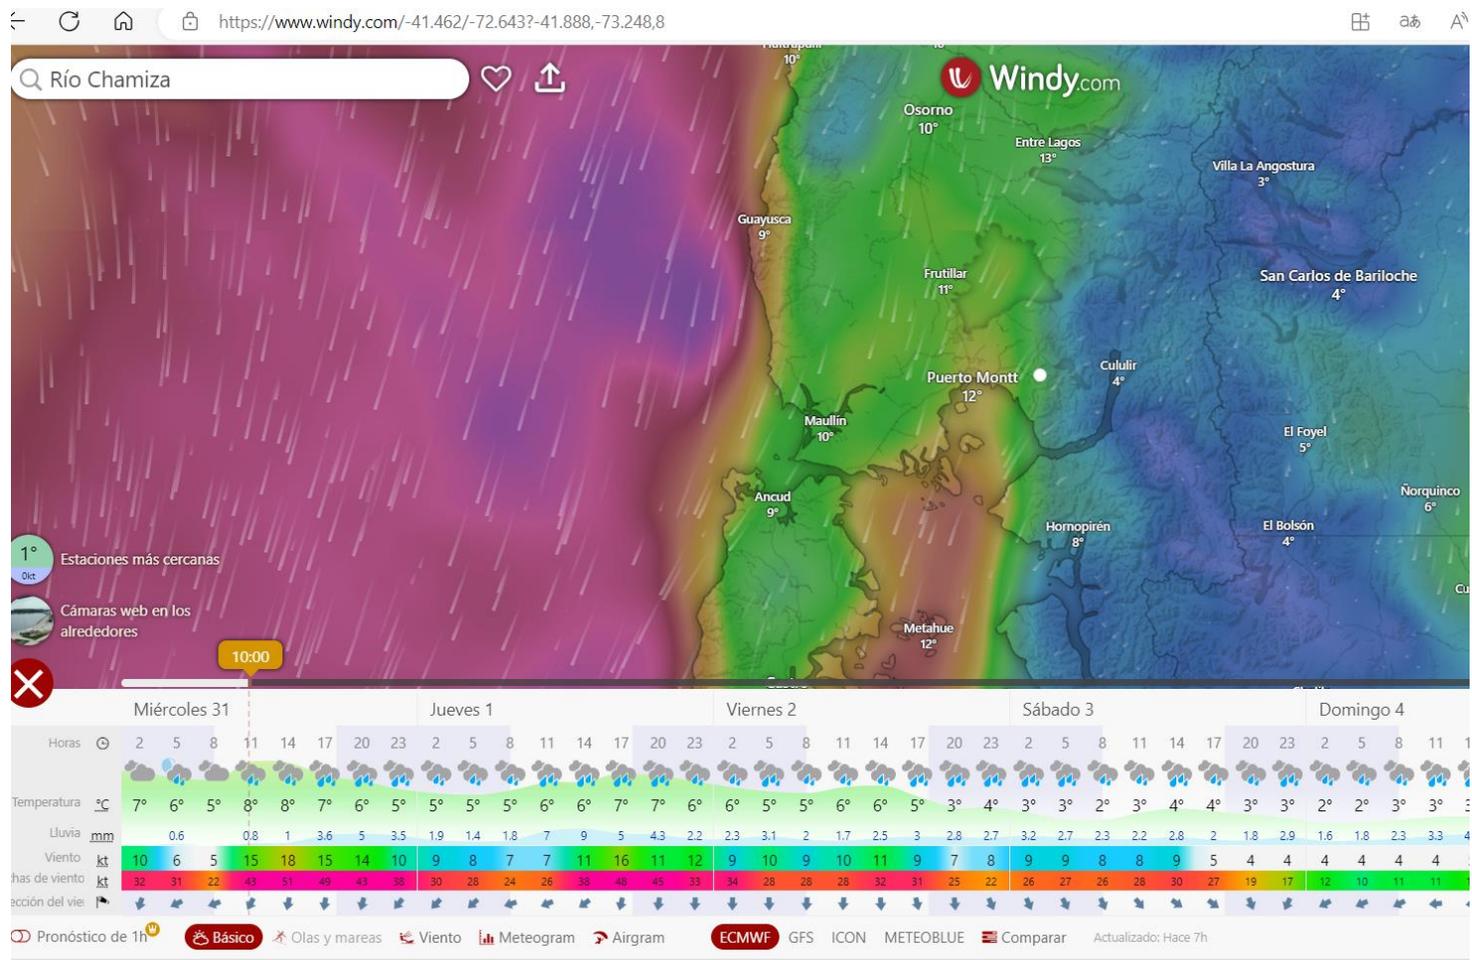

Fuente: Windy

SISTEMA FRONTAL SEMANA 32

Temporal de viento y lluvia el día 05 de agosto de 2024.

