

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA AUMENTO DE PLAZO; EN EL OTROSÍ: EN SUBSIDIO, SOLICITA NUEVO PLAZO.

SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

José Luis García-Huidobro, en representación de Zero Corp SpA, en medida urgente y transitoria (“MUT”) Rol MP-09-202, a la Sra. Marie Claude Plumer Bodin, en su carácter de Superintendente de Medio Ambiente, respetuosamente digo:

En atención a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 19.880, por este acto vengo a solicitar un aumento de plazo para dar cumplimiento al numeral 4 letra a) de la MUT que fue decretada por la SMA a través de la Res. Ex. N° 479/2025, y exigió el retiro inmediato de los acopios de compost que se encuentran fuera del área del proyecto en una superficie aproximada de 1,3 ha, entregando un reporte quincenal (los días lunes) de la cantidad de material retirado y su destino.

a) La solicitud de aumento de plazo

En el reporte presentado por Zero Corp el 16 de junio de 2025, se indicó que *“se estima en la actualidad un área ocupada fuera de la RCA de alrededor de 2,500 m², lo que significa una disminución del espacio en más de 10,000 m². Este espacio actualmente ocupado se encuentra alejado significativamente de cualquier curso de agua. Hasta la fecha y una vez terminadas las medidas de contención de olores, se han retirado 15,789 m³, los cuales han sido vendidos como compost clase B”*.

Si bien a la fecha se ha retirado más del 80% del compost acopiado en lugar no autorizado, la llegada del invierno y el aumento de las precipitaciones han ralentizado el ritmo del retiro, ya que las maquinarias no pueden acceder al sector de acopio, específicamente los camiones y en los lugares de entrega no es posible acceder, dado que los caminos están reventados y colapsados por las últimas precipitaciones en la zona.

Por otro lado, el plazo para dar cumplimiento a la MUT es de 90 días corridos, contados desde la fecha de su notificación, la cual se realizó el 24 de marzo de 2025. Atendido el

próximo vencimiento de este plazo y los factores climáticos ya explicados, existe el fundado temor de no alcanzar a cumplir la MUT dentro del plazo dado por la SMA.

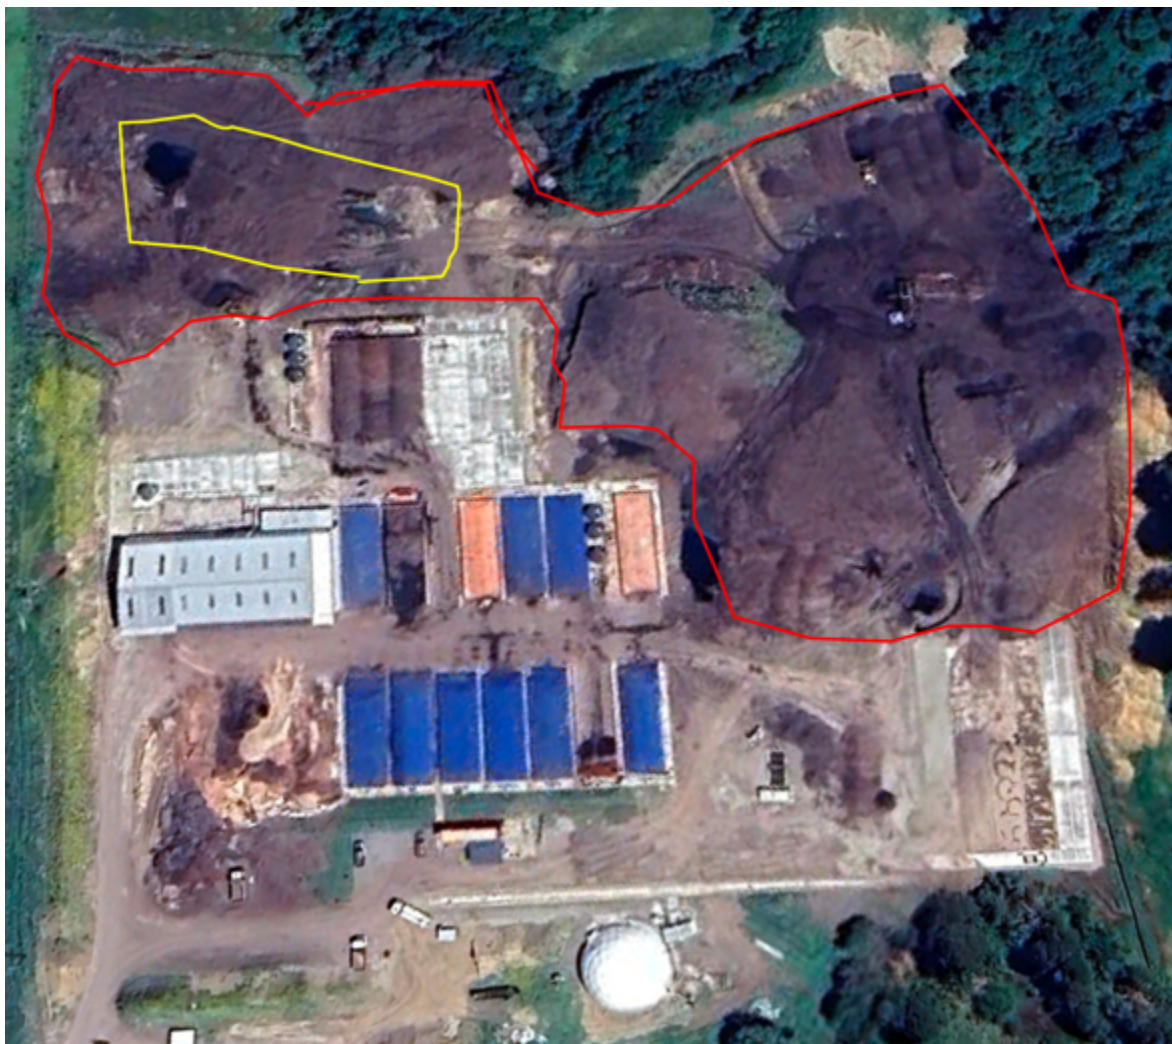


Figura 1: En rojo área total de producto acumulado (más de 13.000 m²).

En amarillo lo pendiente por retirar (aprox. 2.500 m²)

Esta solicitud encuentra su fundamento en el artículo 26 de la Ley N° 19.880, que establece que *“La Administración, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate”*.

b) Explicación de las circunstancias que llevan a solicitar el aumento de plazo y Carta Gantt propuesta.

La pluviometría de los meses de mayo y junio han sido como siempre en la región de Los Lagos y en la zona de Purranque muy alta, permitiendo el ingreso a campos y a la zona de acopio, sin dificultad hasta los primeros días de mayo (esto se puede ver claramente en como ha disminuido paulatinamente la salida de compost de la planta hacia los agricultores), en estos momentos y luego de los frentes que han causado problema en la zona sur del país se hace imposible la extracción del material, por lo que se a trabajado durante estos ultimas semanas en moverlo a un área con RCA y alejando de los cuerpos de agua. Hoy esa gestión a permitido desafectar más de 10.000 m².



Figura 2: Distancia a cuerpos de agua

Como se a informado; en la actualidad el acopio se encuentra a más de 200 metros del estero Potrerillo de las Yaguas y a más de 30 metros de los drenajes del predio, por lo que no existe

ningún tipo de riesgo de escorrentia de material hacia cuerpos de agua, como este material se a voletado un sin numero de veces (llevamos más de 80 días con excavadoras moviendo el material), este a pasado a estar estable, admás se continúan y continuaran con las medidas de control de olores implementadas durante el mes de abril operando hasta que sea restituida en su totalidad el área de acopio fuera de la RCA.



Fotografia 1: Restauración zona de acumulación de Compost

Hasta el momento las zonas ya limpias de compost se han restaurado con pasto y especies nativas de arboles con el objeto de consolidar esas áreas como áreas de paisaje en el entorno de la planta.


A continuación se presenta una carta Gantt tentativa de actividades para el retiro del compost acumulado:

Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Movimiento hacia área con RCA						
Repartos						
Paisajismo						
Informe						

Nota: En la actualidad se informa diariamente de las salidas al Servicio de Salud

EN EL OTROSÍ: En subsidio a lo anterior, solicitamos a la SMA otorgar un nuevo plazo para dar cumplimiento a numeral 4 letra a) de la MUT que fue decretada a través de la Res. Ex. N° 479/2025, en atención a los fundamentos antes expuestos.

Sin otro particular, se despide atentamente,



José Luis García-Huidobro T.
RUT: 7.514.961-1
Representante Legal
Zero Corp SpA
RUT: 77.203.549-7

Crucero, 19 de Junio de 2025
