

Santiago, 7 de marzo de 2023.

MAT: Ajuste de cronograma de ingreso al SEIA

REF: REQ-005-2022

Señora  
Marie Claude Plumer Bodin  
Superintendente del Medio Ambiente  
Superintendencia del Medio Ambiente  
**Presente**

De mí consideración:

Junto con saludar cordialmente, **José Luis Fuenzalida Rodríguez**, en representación de **EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.** ("**Titular**"), ambos domiciliados para estos efectos en Badajoz 45, Piso 8, Las Condes, Región Metropolitana; y en Bulnes 441, Osorno, Región de Los Lagos, **en expediente REQ005-2022**, a la Sra. Superintendente del Medio Ambiente, respetuosamente digo:

Que, para dar cumplimiento al requerimiento de ingreso contenido en la Resolución Exenta N°850, de 6 de junio de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**"), el 14 de junio de 2022, el Titular presentó una carta que contenía el Cronograma con las acciones destinadas a someter el proyecto al SEIA. Dicho Cronograma fue aprobado por la R.EX. N°1288/2022 de la SMA, de 5 de agosto de 2022, y se fijó como fecha de ingreso del proyecto al SEIA, la **semana del 13 de marzo de 2023**.

En ese contexto, por medio de la presente, solicito que se ajuste el cronograma de actividades aprobado por la SMA, ampliando el plazo de ingreso del proyecto al SEIA, hasta el **15 de junio de 2023**, por las razones que se expondrán a continuación:

En primer lugar, el Cronograma presentado por el Titular a la SMA contemplaba 9 meses de duración a partir de su validación por parte de la SMA, no obstante, al momento de aprobarlo, la SMA consideró los 9 meses de plazo a partir de la fecha de presentación del cronograma, es decir, desde el 13 de junio de 2022. Lo anterior significó en los hechos contar con un menor plazo que el previsto inicialmente en la propuesta ya que contado desde la validación (que tuvo lugar en agosto) y no de su presentación (efectuado en el mes de junio).

En segundo lugar, la duración del programa estaba planificada a partir de la realización de las siguientes actividades indicadas en la Carta, las cuales se han efectuado:

Licitación consultor y notificación de orden de proceder de parte de Titular
Entrega información técnica por parte del Titular
Elaboración estudios de Línea de Base
Reuniones SEA y OAECA
Elaboración DIA
Revisión final DIA
Ingreso DIA al SEIA

Sin embargo, con el objetivo de dar a conocer el proyecto a la comunidad y permitir que los ciudadanos puedan plantear sus inquietudes sobre el proyecto antes de la presentación del instrumento al SEIA, el Titular está realizando, además de las actividades programadas, un Proceso de Participación Ciudadana Anticipada (PACA). Se adjunta a esta presentación un informe que da cuenta de las actividades PACA desarrolladas hasta la fecha.

Este proceso en un principio estaba proyectado para ser realizado en cuatro campañas entre **noviembre de 2022 y febrero de 2022**, lo cual permitía ajustarse al cronograma propuesto. No obstante, por recomendación de Ministerio de Energía (División Participación y Relacionamento Comunitario) y Delegación Municipal, para que las campañas de terreno sean más representativas y puedan asistir más personas, se postergaron campañas de fines de **diciembre y febrero**. Además, se visualizó la necesidad de una quinta campaña para dar más tiempo de análisis a las mesas de trabajo acordadas para trabajar con la comunidad.

Como parte del desarrollo de la PACA, y acogiendo la solicitud de parte de la comunidad ante observaciones puntuales respecto a resultados preliminares de los estudios, se planificaron nuevas campañas en terreno para complementar estudios de línea base y presentar una DIA más robusta, como es el caso de limnología, fauna y ruido, **las que se planifica concretar hasta marzo 2023**.

Actualmente, de las campañas planificadas, ya se realizaron dos y quedarían tres pendientes a realizar en **marzo, abril y mayo**.

Por tanto, en atención a lo precedentemente expuesto, y con el sólo propósito de poder dar término a las últimas actividades de PACA con la comunidad, solicito respetuosamente a la Sra. Superintendente que se ajuste el Cronograma de actividades aprobado por la SMA, ampliando el plazo de ingreso del proyecto al SEIA, **hasta el 15 de junio de 2023, inclusive**.

Sin otro particular, se despide atentamente:

JOSE LUIS  
FUENZALIDA  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por  
JOSE LUIS FUENZALIDA  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2023.03.07 09:15:11  
-03'00'



**José Luis Fuenzalida**  
**EMORESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.**



## Informe de Avance

### Participación Ciudadana Anticipada

# Proyecto Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
ELABORADO	Fairuz Fallouh Torres Pablo Zapata González	Especialistas PAC Consultora Engage	 	
REVISADO	Alberto Besserer Fernández	Encargado de Relacionamento Comunitario y Socialización SAESA		
APROBADO				
<b>EMISIONES</b>				
REVISIÓN	A	B	C	D
FECHA	Marzo / 2023			

## Índice General

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>3</b>
2.1 OBJETIVO GENERAL	3
2.2 OBJETIVO GENERAL	4
<b>3. METODOLOGÍA</b>	<b>4</b>
<i>Fase 1: Presentación de estado actual del proyecto y de estudios ambientales</i>	5
<i>Fase 2: Respuesta a Observaciones y definición de Metodología de trabajo PACA</i>	5
<i>Fase 3: Jornadas de trabajo con la comunidad</i>	5
<i>Fase 4: Formulación de Acuerdos y Desacuerdos PACA</i>	5
3.1 TÉCNICAS PARTICIPATIVAS	6
<i>Reuniones Ampliadas</i>	6
<i>Reuniones Focalizadas</i>	6
<i>Metodología de diálogo, acuerdos y desacuerdos</i>	6
<b>4. ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO</b>	<b>7</b>
4.1 ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DENTRO DEL AIMH	7
4.2 COORDINACIÓN CON DELEGADO MUNICIPAL DE PUERTO GUADAL	8
4.3 DESARROLLO MATERIALES DE PRESENTACIÓN	8
4.4 CONVOCATORIA A ACTIVIDADES	8
<i>Llamadas telefónicas</i>	9
<i>Envío de invitaciones por WhatsApp</i>	9
<i>Entrega de invitaciones presenciales</i>	9
<i>Envío de invitaciones por email</i>	9
<i>Aviso radial</i>	9
<b>5. DESARROLLO FASE 1</b>	<b>9</b>
5.1 DINÁMICA DE LAS ACTIVIDADES	9
5.2 REUNIONES EJECUTADAS DURANTE FASE 1	10
5.3 RESUMEN TEMAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD FASE 1	13
5.4 COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y RESPUESTAS PENDIENTES	13
<b>6. RESULTADOS FASE 2 PACA</b>	<b>14</b>
6.1 DINÁMICA DE LAS ACTIVIDADES	14
6.2 REUNIONES EJECUTADAS EN SEGUNDA CAMPAÑA PACA	15
6.3 RESUMEN TEMÁTICAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD FASE 2	17
6.4 FORMA DE TRABAJO ACORDADA CON LA COMUNIDAD	17
<b>7. PRÓXIMAS ACCIONES</b>	<b>19</b>

## 1. Introducción

Dentro de la presente Declaración de Impacto Ambiental, Edelaysen (Titular) como titular del proyecto “Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis” (Proyecto) ubicado en la comuna de Chile Chico, en la región de Aysén, ha desarrollado actividades de Participación Ciudadana previo ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con la finalidad de informar y dialogar sobre el Proyecto con la comunidad de Puerto Guadal y alrededores, asentamiento humano ubicado en el área de influencia del Proyecto.

Las actividades de Participación Ciudadana Anticipada están consideradas en la normativa del SEIA, donde se considera la posibilidad de que los titulares de proyectos realicen actividades de participación antes de la presentación al SEIA, bajo la idea de que es conveniente tener un acercamiento temprano con los potenciales involucrados en un Proyecto.

Por otro lado, la “Guía para la Participación Anticipada de la Comunidad en proyectos que se presentan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2013), señala que: *“el objetivo que se persigue con la participación anticipada es que el titular pueda informar oportunamente a la comunidad y considerar sus opiniones de forma previa a la evaluación ambiental de los proyectos, teniendo en cuenta que los/as vecinos/as conocen su entorno y manejan información relevante sobre el lugar donde viven. En este sentido, la implementación de instancias de participación anticipada contribuye a que posteriormente la evaluación ambiental del proyecto se base en información más completa y acertada. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que los titulares conozcan a tiempo las inquietudes de la gente y puedan resolverlas antes de que se conviertan en situaciones complejas, a la vez que permite recoger información clave para resolver problemas, mitigar impactos o enfrentar imprevistos, que sólo aquellos que viven o trabajan en el lugar pueden aportar”*.

Considerando lo anterior, el Titular ha considerado la realización de un proceso de Participación Ciudadana Anticipada con la comunidad de Puerto Guadal, el cual permita por un lado informar oportunamente a la comunidad de las características y alcances del Proyecto; reconocer e identificar las principales preocupaciones de la población y también incorporar en el diseño y desarrollo del Proyecto, ello en pro de lograr un clima de confianza y promoción de la transparencia en torno al proceso de evaluación ambiental del Proyecto.

Conforme a lo anterior, en el presente Informe presenta el avance realizado a la fecha del proceso de Participación Ciudadana Anticipada.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo General

Establecer un relacionamiento comunitario temprano que acompañe y apoye la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis”, con grupos humanos y organizaciones de interés dentro del área de influencia de medio humano del Proyecto que permita informar y dialogar con la comunidad sobre el proyecto.

## 2.2 Objetivo General

Informar de forma anticipada a los grupos humanos y grupos de interés del área de influencia de medio humano del Proyecto sobre las características del mismo y la caracterización ambiental realizada en torno de la evaluación ambiental del Proyecto.

Identificar y sistematizar las observaciones, opiniones, comentarios y sugerencias del Proyecto por parte de estos actores respecto al mismo y sus características.

Elaborar de forma co-gestionada una relación entre Titular y comunidad orientada a incorporar observaciones realizadas por la comunidad al diseño y desarrollo, así como en la definición de posibles Compromisos Ambientales Voluntarios.


## 3. Metodología

Para cumplir con los objetivos plantados de la Participación Ciudadana Anticipada (PACA), se consideró como referentes metodológicos a la Guía para la Participación Anticipada de la Comunidad en Proyectos que se presentan al SEIA (SEA, 2013) y la Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía (Ministerio de energía, 2015).

En este sentido, a las tres etapas que plantea la Guía de Participación Ciudadana Anticipada del SEA (2013), a saber: plantea metodológicamente tres etapas, la Etapa I: Diagnóstico de escenario e identificación de actores y sus características; Etapa II: Entrega de información a los distintos grupos identificados; y Etapa III: Recolección e incorporación de las opiniones de la comunidad (alcances consultivos y resolutivos), se incorporó una etapa de definición metodológica cogestionada con la comunidad en propósito de generar un proceso de Planificación conjunta con la comunidad, tal como establece la Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía (2015).

De esta forma se desarrolló una metodología que permitió el diseño y desarrollo de la Participación Ciudadana Anticipada en 4 etapas sucesivas que permitieron a la comunidad informarse de las características del proyecto, definir formas de trabajo, discutir temáticas específicas y llegar a acuerdos.

Figura 3-1: Etapas Desarrollo PACA

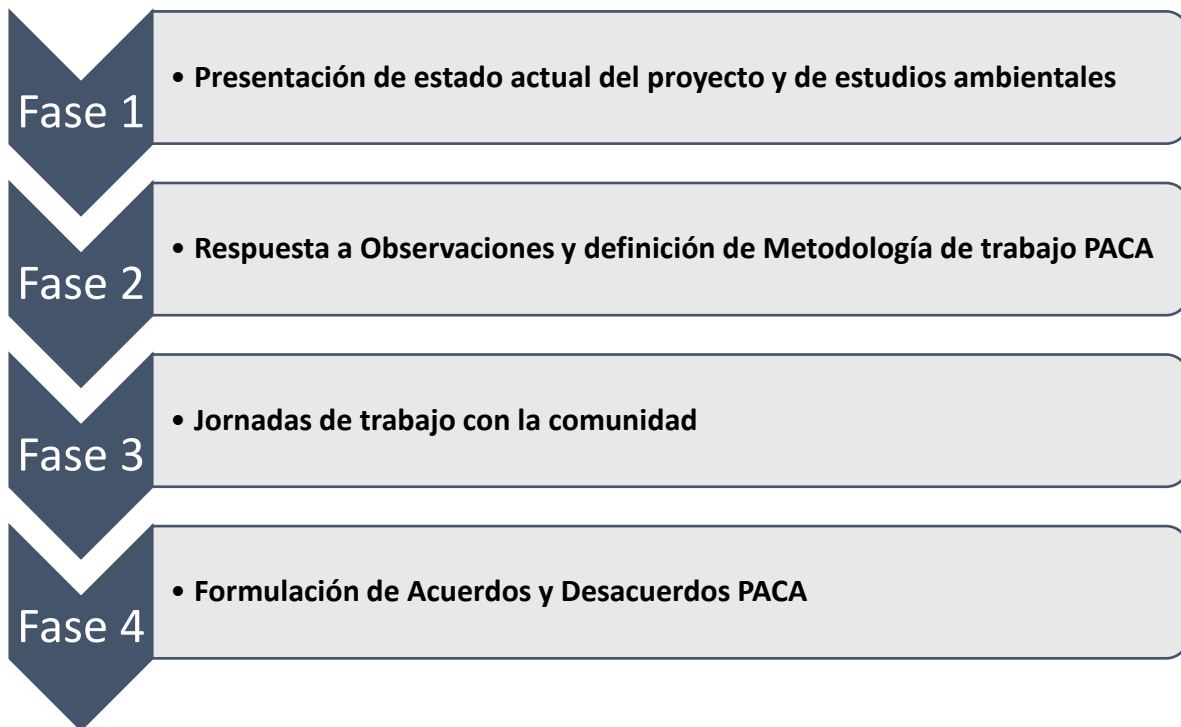

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se presentan la descripción de cada una de las fases:

*Fase 1: Presentación de estado actual del proyecto y de estudios ambientales*

La Fase 1, tiene como objetivo la presentación de la situación inicial del Proyecto y resultados de estudios ambientales, considerando las particularidades del mismo. Para ello se establecieron reuniones focalizadas con cada una de las organizaciones sociales presentes en el área de influencia de medio humano y también con otros grupos de interés.

*Fase 2: Respuesta a Observaciones y definición de Metodología de trabajo PACA*

La Fase 2, consideró la elaboración de respuestas a la comunidad respecto a inquietudes en relación a las características del Proyecto y los estudios ambientales desarrollados para la presentación del mismo al SEIA. Luego de ello, se estableció una metodología co-gestionada con la comunidad con el fin de definir la forma de trabajo en temáticas de interés para los participantes de las actividades PACA.

*Fase 3: Ejecución de Mesas de Trabajo (por ejecutar)*

La Fase 3 (pendiente) tiene como objetivo la ejecución de Mesas de Trabajo con la comunidad organizadas por temáticas de interés. Esta metodología de trabajo, las mesas de trabajo, fue elegida por los vecinos de Puerto Guadal mediante elección a mano alzada realizada durante la Fase 2.

Los objetivos de la ejecución de las mesas de trabajo es elaborar consensos y materializar la incorporación de las observaciones ciudadanas en el diseño y desarrollo del Proyecto, así como en los Compromisos Ambientales Voluntarios.

*Fase 4: Formulación de Acuerdos y Desacuerdos PACA*

Finalmente, a modo de formalizar el trabajo desarrollado en fases anteriores, se dejó en actas por temática planteada los acuerdos alcanzados en conjunto con la comunidad, así como también la identificación de temáticas donde no se pudo llegar a consenso.

### 3.1 Técnicas Participativas

Para la elaboración de las actividades de relacionamiento comunitario en el contexto de la Participación Ciudadana Anticipada, se elaboraron las siguientes técnicas de participación ciudadana:

#### Reuniones Ampliadas

Reuniones con la comunidad consistentes en una actividad abierta a todas las personas que quieran participar. Las reuniones ampliadas permiten entregar información a un número amplio de personas en una sola actividad; generalmente, consiste en una exposición -que en este caso consistirá en una presentación que resuma los objetivos del proceso, las características del Proyecto, entre otros- y una ronda de preguntas y respuestas.

#### Reuniones Focalizadas

Reuniones con grupos específicos que permiten conocer o profundizar en temáticas específicas que son de un grupo en particular de vecinos u organizaciones. Las reuniones focalizadas se realizan mediante una convocatoria a un grupo específico de vecinos o a personas con características comunes de trabajo.

#### Talleres de cartografía participativa

Constituye una herramienta de gran relevancia para el fortalecimiento de procesos de investigación y planeación, ya que son las propias comunidades o grupos sociales quienes representan su espacio geográfico y la proyección que hacen de éste. Los métodos visuales, como los mapas, facilitan la comprensión de la información, permitiendo fomentar la participación de un mayor número de personas, a la vez que aumenta el diálogo y acuerdos.

En términos concretos, para las actividades con las comunidades, se propone realizar asambleas donde, en primera instancia, se muestre una presentación que resuma los objetivos de la actividad y del proceso de participación ciudadana, para luego formar grupos trabajo con un moderador que mostrará y explicará planos con detalles de propuestas, con el objetivo de que los participantes puedan manipular los planos para lograr comprender dichas propuestas y su inserción territorial, exponer sus consultas y manifestar si están de acuerdo con éstas, si se requiere realizarle alguna modificación, si la rechazan y/o si tienen propuestas distintas.

#### Metodología de diálogo, acuerdos y desacuerdos.

Esta Metodología parte de la premisa de que *“El diálogo es un proceso de interacción genuina a través del cual los seres humanos se escuchan de manera lo suficientemente profunda para que aquello que aprenden los cambie. Cada uno hace un esfuerzo real por tener en cuenta las preocupaciones del otro como si fuesen propias, inclusive cuando persiste el desacuerdo. Ningún participante renunciará a su identidad, sin embargo, cada uno actuará de manera diferente frente al otro pues reconoce lo suficiente las peticiones humanas de los demás (Pruitt & Thomas, 2007)”*.



La Metodología de Diálogo considera que parte del proceso y de la resolución de este, es tener acuerdos y desacuerdos, los cuales quedarán consignados en los protocolos de acuerdo que emanen de las actividades dentro de la Participación Ciudadana Anticipada.

#### Registro de información

Con el objetivo de documentar el proceso de Participación Ciudadana Anticipada, se sistematizó cada una de las reuniones realizadas, mediante minutas que contienen el registro de los temas tratados, las consultas, opiniones de los vecinos que participan en las actividades. También, como método de registro, se elaboraron listas de asistencias y registro fotográfico que dan cuenta de los participantes y desarrollo de la actividad respectivamente.

## 4. Estrategia de Acercamiento Comunitario

Previo a la ejecución de las jornadas de Participación Ciudadana Anticipada, se realizaron una serie de acciones orientadas a lograr la mayor cantidad de participación de dirigentes y vecinos de Puerto Guadal en dichas actividades, junto con lograr generar los insumos necesarios para que la información respecto al Proyecto fuera recepcionada de manera clara. Las coordinaciones previas fueron las siguientes:

### 4.1 Actualización Registro de Organizaciones Sociales dentro del área de influencia de medio humano

Desde el año 2019 hasta el 2021, previo a la construcción del Proyecto, se realizó un proceso de relacionamiento con la comunidad de Puerto Guadal, con el objetivo de informar a esta última respecto al Proyecto. A partir de este proceso, existía un registro de las organizaciones sociales de la localidad, las que sirvieron de base para generar la coordinación de la Participación Ciudadana Anticipada.

Con el objetivo de actualizar dicho registro, se generaron llamadas telefónicas a cada uno de los dirigentes sociales que participaron de ese proceso participativo, y se les consultó por las directivas actuales de cada organización, así como del surgimiento de nuevas agrupaciones, las cuales se sumaron al registro y se consideraron para la convocatoria de la Participación Ciudadana Anticipada. Las organizaciones sociales identificadas en el área de influencia de medio humano del Proyecto y otros grupos de interés con interés en el Proyecto son las siguientes:

*Tabla 4-1: Organizaciones Territoriales*

Comuna o sector	Organización
Puerto Guadal	Junta de Vecinos Los Pioneros
Puerto Guadal	Junta de Vecinos N°8

*Tabla 4-2: Organizaciones Funcionales*

Comuna o sector	Organización
Puerto Guadal	Comité de Agua Potable Rural (APR)
Puerto Guadal	Consejo Consultivo de Salud

Comuna o sector	Organización
Puerto Guadal	Organización Sin Fines de Lucro de Adultos mayores y Personas con Discapacidad ORGIN
Puerto Guadal	Club de Rayuela
Puerto Guadal	Club deportivo femenino Las Pumas de Guadal
Puerto Guadal	Asociación Los Maquis Libres
Puerto Guadal	Tercera Compañía de Bomberos de Puerto Guadal
Puerto Guadal	Escuela Bernardo O'Higgins
Región de Aysén	Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA)
Cuenca Lago General Carrera	Corporación Desarrollo Sustentable Lago General Carrera (Chelenko)
Región de Aysén	Aisén Reserva de Vida
Nacional	Comité de Defensa de la Flora y Fauna CODEFF
Nacional	Fundación Ñankulafken
Internacional	ONG Ríos to Rivers
Nacional	Fundación Naturaleza Pública

Tabla 4-3: Asociaciones Gremiales

Comuna o sector	Organización
Puerto Guadal	Asociación Gremial de Pirquineros
Puerto Guadal	Asociación Gremial de Orfebres
Puerto Guadal	Asociación Gremial de Cultura, Turismo y Artesanía
Puerto Guadal	Asociación Gremial de Campesinos

## 4.2 Coordinación con delegado Municipal de Puerto Guadal

Con el objetivo de coordinar las actividades y mantener informada a la municipalidad de Chile Chico respecto a las actividades generadas con la comunidad, se generó contacto con el Delegado del Municipio en Puerto Guadal con quien se coordinó la utilización de los espacios para algunas de las reuniones, tal como la Casa de la Cultura y la Sede comunitaria, considerando que dentro de la infraestructura social presente en la localidad de Puerto Guadal, estas constituyen espacios de reunión para toda la comunidad.

## 4.3 Desarrollo Materiales de Presentación

Con el fin de entregar la información respecto al proyecto de forma clara y esquemática, se desarrolló una presentación en formato *Power Point*, la cual incorporó información de las distintas especialidades ambientales y de participación ciudadana, con el fin de presentar todos los detalles relevantes a la ciudadanía. Además, esta presentación es un insumo que se envió a todos los asistentes a través de correo electrónico posterior a la actividad, por lo que también permitió que la información fuera analizada en detalle por la comunidad, y enviar nuevas consultas o comentarios una vez realizado dicho análisis.

## 4.4 Convocatoria a actividades

Teniendo en cuenta que no todos los vecinos cuentan con el mismo manejo de tecnología y acceso a internet, la convocatoria a las actividades se realizó a través de distintos formatos, con el objetivo de garantizar que toda la comunidad recibiera la información, a saber:

Llamadas telefónicas: se llamó por teléfono a todos los dirigentes sociales de las organizaciones catastradas y se coordinó con cada uno de ellos el día, hora y lugar de las reuniones de la primera ronda de Participación Ciudadana Anticipada; dichas actividades fueron recordadas también por teléfono una semana y un día antes de la fecha acordada.

Para la segunda ronda de actividades, también se informó a los dirigentes sociales de las reuniones y sus respectivos objetivos.

Envío de invitaciones por WhatsApp: se enviaron las invitaciones a las actividades a través de este medio, con el detalle de fechas, lugares, horarios, etc. La comunicación por WhatsApp facilita a los vecinos el acceso a la información y el poder compartirla con el resto de la comunidad, por lo que también refuerza la convocatoria.

Entrega de invitaciones presenciales<sup>1</sup>: Para asegurar que aquellos vecinos que no participan en organizaciones sociales pudieran ser informados de las actividades, se distribuyeron invitaciones impresas en distintos puntos de Puerto Guadal y se pegaron en sitios visibles, como supermercados.

Envío de invitaciones por email: Con el objetivo de formalizar el envío de invitaciones por WhatsApp y el aviso telefónico, en los casos en que fue solicitado, se informó a los dirigentes sociales de las actividades vía correo electrónico.

Aviso radial: como complemento al aviso personalizado de las actividades a los dirigentes sociales, y para asegurar que la información llegara a toda la comunidad, se efectuaron avisos radiales a través de la Radio Tu de Chile Chico, la cual es escuchada en Puerto Guadal<sup>2</sup>.

## 5. Desarrollo Fase 1

Posterior a las actividades de coordinación, se ejecutó la primera campaña de Participación Ciudadana, cuyo objetivo fue informar a la comunidad de Puerto Guadal respecto a las características del Proyecto Los Maquis y el estado actual de éste y de los estudios ambientales en desarrollo. Junto con esto, se buscaba levantar las apreciaciones de la comunidad respecto al Proyecto, sus consultas, sugerencias y solicitudes, con el fin de analizarlas y evaluar su inserción en el proyecto.

### 5.1 Dinámica de las Actividades

En esta primera campaña se realizaron reuniones focalizadas con todas las organizaciones sociales de Puerto Guadal. El objetivo de esta dinámica fue informar de primera fuente a las bases organizacionales de la comunidad, para que estos pudieran bajar la información a sus socios e instarlos a participar de las próximas acciones.

Las reuniones focalizadas permitieron entregar la información de manera detallada e individualizada a los dirigentes sociales, profundizando y reforzando las temáticas de interés de cada organización, así como aclarar todas las dudas planteadas o registrarlas en

<sup>1</sup> Se adjunta invitación en anexos

<sup>2</sup> Se adjunta aviso radial en anexos

el caso de no contar con la respuesta en el momento; esto permitió que en las próximas actividades ampliadas, los detalles del Proyecto ya fueran manejados por la comunidad, permitiendo una relación más horizontal debido al manejo de la información.

## 5.2 Reuniones Ejecutadas durante Fase 1

Luego de realizadas las actividades focalizadas con los dirigentes sociales y algunos socios que también participaron de las reuniones, se realizó una reunión ampliada, donde se hizo un llamado a participar a toda la comunidad, y donde también asistió el alcalde y el Concejo Municipal de Chile Chico, quienes también reforzaron la convocatoria.

Así, durante la primera campaña de actividades de Participación Ciudadana Anticipada, se llevó a cabo entre los días 22 y 24 de noviembre de 2022, y se realizaron 10 reuniones con dirigentes sociales y vecinos de Puerto Guadal, las que se detallan a continuación:

Tabla 5-1: Reuniones Primera Campaña PACA

Fecha	Hora	Organización Social	Lugar	N° Asistentes Organización	Participantes Empresa	Objetivo reunión
22.11.2022	14:30	Comité Agua Potable Rural (APR) Puerto Guadal	Oficina APR Puerto Guadal	4		<p>Informar a la comunidad de Puerto Guadal respecto a las características del Proyecto, sus objetivos y estado actual. Asimismo, explicar el proceso Participación Ciudadana Anticipada y de evaluación ambiental, junto con presentar los resultados preliminares de los estudios ambientales en desarrollo.</p> <p>Junto con esto, se busca levantar las apreciaciones de la comunidad respecto al Proyecto, sus consultas, sugerencias y solicitudes, con el fin de analizarlas y evaluar su inserción en el proyecto.</p>
22.11.2022	16:30	Tercera Compañía de Bomberos de Puerto Guadal	Cuartel Tercera Compañía de Bomberos de Puerto Guadal	2	Gerente de Proyecto Los Maquis.	
22.11.2022	20:30	Consejo Consultivo de Salud y Comité Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de Puerto Guadal	Casa de la Cultura de Puerto Guadal	5	Encargado Relacionamento Comunitario y Socialización. Encargado zonal del Titular.	
23.11.2022	10:00	Junta de vecinos Los Pioneros, Puerto Guadal	Casa particular, presidente JJVV.	5	Consultora Foco Ambiental (Estudios Ambientales), Consultora Engage (Participación Ciudadana)	
23.11.2022	12:00	Organización Los Maquis Libres	Casa de la Cultura de Puerto Guadal	3		
23.11.2022	15:00	Asociación Gremial de Cultura, Turismo y Artesanía Puerto Guadal	Casa de la Cultura de Puerto Guadal	5		
23.11.2022	17:00	Club Deportivo Femenino Las Pumas de Guadal	Casa particular, presidenta Club Deportivo	3		

Fecha	Hora	Organización Social	Lugar	N° Asistentes Organización	Participantes Empresa	Objetivo reunión
23.11.2022	19:00	Asociación Gremial de Pirquineros y Asociación Gremial de Orfebres, Puerto Guadal	Sede social AG Pirquineros	4		
23.11.2022	20:30	Club de Rayuela, Puerto Guadal	Casa de la Cultura de Puerto Guadal	3		
24.11.2022	14:00	Reunión ampliada con: Alcalde e integrantes del Concejo Municipal Chile Chico y, vecinos de Puerto Guadal	Sede comunitaria Puerto Guadal	13		

### 5.3 Resumen Temas de interés de la comunidad Fase 1

Respecto a las apreciaciones, consultas e inquietudes de la comunidad de Puerto Guadal en las reuniones de la Fase 1. A continuación, se presenta un resumen de aquellas temáticas que despertaron más interés entre los asistentes:

*Tabla 5-2: Resumen Principales Temáticas 1era Campaña PACA*

Temática	Solicitud u observación
<b>Energía Eléctrica</b>	Consultas por la posibilidad de acceder a rebajas en cuentas de luz.
	La población de Puerto Guadal necesita la energía eléctrica de la central, que está construida y sin usar.
	Consultas por acceder a proyectos
<b>Impactos Ambientales</b>	Solicitud de Asociación Los Maquis Libre de realizar un EIA y no una DIA.
	Solicitud de extender las campañas de ruido, ya que habría vecinos y operadores turísticos que se verían afectados por el ruido de la central.
	Solicitud de realizar una campaña extra de fauna ictica
	Los focos de la central generarían contaminación lumínica, solicitan disminuir su potencia.
	Señalan que identifican un impacto visual en el paisaje producto de las tuberías y la central.
	Solicitud de Asociación Los Maquis Libre de desestimar la operación transitoria de la Central mientras se tramita la evaluación ambiental.
<b>Beneficios para la comunidad</b>	Valoración del sendero turístico que se considera como parte del proyecto; solicitud de considerar la opinión de la comunidad en el diseño-.
	La energía eléctrica que genere la central será positiva para Puerto Guadal, ya que se ven afectados por constantes cortes de luz.
	Sería positivo que se mantenga el camino de maquinarias que llega hasta los pozones (usado para la construcción), para uso de peatones, el cual ya es utilizado por vecinos y turistas, ya que es más seguro que el existente
<b>Paisajismo y Terminaciones del proyecto</b>	Sería positivo poner en valor las maquinarias de la central antigua (considerado en el proyecto)
	Solicitud de realizar paisajismo para reducir el impacto visual de la central.

### 5.4 Compromisos Adquiridos y respuestas pendientes

A partir de las distintas temáticas tratadas en las reuniones, surgieron algunas consultas y solicitudes que no pudieron resolverse en la misma actividad, por lo que se estableció el compromiso de analizarlas y responderlas en la segunda campaña de Participación Ciudadana Anticipada, en específico, las observaciones con respuestas pendientes fueron las siguientes:

- Solicitud de ampliar campañas de Ruido
- Solicitud de apagar luminaria de bocatoma y sala de máquinas
- Solicitud de ejecutar una campaña extra de fauna íctica

- Dar respuesta a la petición del alcalde respecto a incorporar baños, basureros y estacionamientos dentro del sendero turístico.
- Solicitud de Asociación Los Maquis Libre de desestimar operación transitoria de la central mientras se tramita la evaluación ambiental.
- Solicitud de Asociación Los Maquis Libre de desarrollar un EIA y no una DIA.
- Dar respuestas carta JJ.VV. N°8<sup>3</sup>

## 6. Desarrollo Fase 2

En las reuniones de la primera campaña de Participación Ciudadana Anticipada se estableció con los asistentes que se realizaría una segunda ronda de actividades de Participación Ciudadana Anticipada con la comunidad de Puerto Guadal, con el fin de seguir avanzando en los temas pendiente y en la definición de acuerdos. Así, los objetivos de esta campaña fueron:

- Realizar la presentación del estado actual del Proyecto y los estudios ambientales a aquellas organizaciones sociales y vecinos que no pudieron participar en la primera campaña PACA.
- Informar a toda la comunidad respecto a las actividades de Participación Ciudadana Anticipada realizadas durante la primera campaña en noviembre de 2022.
- Dar respuesta a las observaciones y solicitudes realizadas durante la primera ronda de reuniones, frente a las cuales se comprometió dar una respuesta formal.
- Definir, en conjunto con la comunidad, la metodología de trabajo de las próximas actividades de la PACA, en las que se buscará generar acuerdos con la ciudadanía.
- Revisar y acordar los temas del Proyecto que serán analizados en conjunto con la comunidad.

### 6.1 Dinámica de las actividades

Para concretar los objetivos de la segunda campaña, se realizaron reuniones ampliadas tanto para dirigentes sociales como los vecinos en general, por un lado, para informar respecto a las características y estado actual del proyecto a quienes no pudieron participar de la primera campaña y a quienes viven fuera de Puerto Guadal (Coyhaique); y, por otro lado, para definir en conjunto la metodología de trabajo de las próximas actividades que buscarán llegar a acuerdos con la comunidad.

---

<sup>3</sup> Se adjunta en anexos.



---

## 6.2 Reuniones Ejecutadas en Segunda Campaña de Participación Ciudadana Anticipada

La segunda campaña PACA se llevó a cabo entre los días 09 y 11 de enero de 2023, y se sostuvieron reuniones en la ciudad de Coyhaique y en la localidad de Puerto Guadal. Así, se realizaron tres reuniones ampliadas, donde se convocó a toda la comunidad. Cabe señalar que la actividad realizada en Coyhaique se desarrolló mediante modalidad híbrida, es decir, con asistentes presenciales y otros conectados virtualmente, esto a petición de los mismos dirigentes que se encontraban fuera de dicha ciudad y querían informarse respecto al Proyecto:

Tabla 6-1: Reuniones segunda campaña Participación Ciudadana Anticipada

Fecha	Hora	Lugar	Organizaciones Social	N° Asistentes Organización	Participantes Empresa	Objetivo reunión
09.01.2023	17:00	Salón de Reuniones Casa Sinergia Coyhaique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CODESA</li> <li>- Corporación Aysén Reserva de Vida</li> <li>- Fundación Ñankulafken</li> <li>- Comité de Defensa de la Flora y Fauna CODEFF</li> <li>- Corporación Desarrollo Sustentable Lago General Carrera (Chelenko)</li> </ul>	6	Gerente de Proyecto Los Maquis, Encargado Relacionamento Comunitario y Socialización, Consultora Foco Ambiental (Estudios Ambientales), Consultora Engage (Participación Ciudadana)	<p>Informar a los dirigentes sociales y vecinos que no pudieron participar de la primera campaña de Participación Ciudadana Anticipada, respecto a las características del proyecto, sus objetivos y estado actual. Asimismo, explicar el proceso de Participación Ciudadana Anticipada y de evaluación ambiental, junto con presentar los resultados preliminares de los estudios ambientales en desarrollo.</p> <p>Junto con esto, se busca levantar las apreciaciones de la comunidad respecto al Proyecto, sus consultas, sugerencias y solicitudes, con el fin de analizarlas y evaluar su inserción en el mismo.</p>
10.01.2023	18:30	Casa de la Cultura de Puerto Guadal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación Gremial de Pirquineros</li> <li>- Escuela Bernardo O'Higgins</li> <li>- APR Puerto Guadal</li> <li>- Vecinos sin participación en organizaciones sociales</li> </ul>	11		
11.01.2023	18:30	Casa de la Cultura de Puerto Guadal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APR Puerto Guadal</li> <li>- Asociación Gremial de Turismo</li> <li>- Junta de Vecinos N°8</li> <li>- Servicio País</li> <li>- Organización Los Maquis Libres</li> <li>- ONG Ríos To Rivers</li> <li>- Fundación Naturaleza Pública</li> <li>- Lodge El Mirador de Guadal</li> <li>- CODESA</li> <li>- Vecinos sin participación en organizaciones sociales</li> </ul>	21		<p>Dar respuesta a las observaciones y solicitudes realizadas durante la primera ronda de reuniones, frente a las cuales se comprometió dar una respuesta formal. Junto con esto, definir, en conjunto con la comunidad, la metodología de trabajo de las próximas actividades de la Participación Ciudadana Anticipada, en las que se buscará generar acuerdos con la ciudadanía y definir las terminaciones del Proyecto.</p>

### 6.3 Resumen Temáticas de Interés de la Comunidad Fase 2

En cuanto a las principales observaciones, consultas y solicitudes que plantearon los dirigentes y vecinos en las reuniones, a continuación, se presenta un resumen de las que más se repitieron entre los asistentes:

Temática	Solicitud u observación
<b>Paisajismo y Terminaciones del proyecto</b>	Solicitud de que el paisajismo y terminaciones de arquitectura del proyecto no genere una intervención mayor en el territorio.
	Solicitud de generar mantención para que el paisajismo perdure.
	Solicitud de participar en la definición de las especies que se usarán en el paisajismo.
<b>Energía Eléctrica</b>	Se señala que la población de Puerto Guadal, sobre todo la escuela, necesita la energía que generará el Proyecto, ya que les afectan los reiterados cortes de luz, ya que también implican cortes de agua.
<b>Impactos Ambientales</b>	Se reitera el desacuerdo por parte de Los Maquis Libre respecto a mantener la solicitud de operación transitoria de la central, mientras se encuentra en tramitación ambiental.
	Se señala que el ruido de la central podría afectar a los vecinos más cercanos y a los operadores turísticos y turistas que visiten la zona.
	Se solicita realizar nuevas campañas de flora y fauna, para verificar la presencia de algunas especies y descartar su descartar afectación.
	Solicitud de generar estudios de caudales, para evaluar el impacto que podría generar la central en el río.
	Solicitud de Los Maquis Libre de desarrollar un EIA y no una DIA
<b>Beneficios para la comunidad</b>	Se señala que el proyecto será beneficioso para la comunidad al reforzar el sistema eléctrico, además, será un aporte para el turismo de la zona.
	Se señala que sería positivo que el camino de maquinaria quedara habilitado para peatones.

### 6.4 Forma de Trabajo Acordada con la Comunidad

En la reunión ampliada enfocada en definir la forma de trabajo, se planteó a la comunidad una serie de propuestas respecto a la metodología de las próximas actividades y de los temas específicos a trabajar, las cuales fueron analizadas y complementada por los asistentes, llegando a un consenso. La propuesta presentada fue la siguiente:



Finalmente, lo acordado fue lo siguiente:

Tipo de reuniones	Mesas de Trabajo <sup>4</sup>
Temas de las Mesas de Trabajo	Terminaciones del Proyecto y Turismo
	Temas ambientales y Patrimonio Sociocultural
	Inversión Social

Por otro lado, se adquirieron una serie de compromisos para las próximas instancias de Participación Ciudadana Anticipada:

- Envío a participantes de las Presentaciones realizadas a la comunidad
- Coordinación permanente y anticipado de las próximas actividades (aviso anticipado)
- Coordinar en conjunto con los inscritos en las mesas de trabajo el mensaje comunicacional que se dará a la comunidad para convocar a dichas mesas.

<sup>4</sup> Composición de mesas de Trabajo sin número máximo de participantes por cada mesa; se realizará una convocatoria ampliada para que cualquier persona pueda unirse a la Mesa.

## 7. Próximas Acciones

Dadas las peticiones realizadas por la comunidad de Puerto Guadal de precisar y/o profundizar en aspectos puntuales de los estudios de línea de base del proyecto, presentados en las campañas de noviembre del 2022 y enero del 2023, tales como: el aumento de receptores de ruido; la profundización de caracterización de fauna; la identificación descrita por vecinos de la presencia de especies de flora en categoría de conservación; entre otras y, por otro lado, la elección de la comunidad de trabajar en mesas de trabajo de temáticas de interés específicas (turismo, ambiente e inversión social) hace necesaria la reformulación de la calendarización de actividades pendientes a ejecutar, que corresponden a la realización de las mesas de trabajo y formulación de actas de cierre de la PACA, que se proyecta terminen en el mes de mayo de 2023.

Esta recalendarización debe considerar el tiempo necesario para levantar y analizar la nueva información entregada o solicitada por parte de la comunidad de Puerto Guadal.

Por otro lado, durante el desarrollo de la segunda campaña de actividades de la Participación Ciudadana Anticipada, realizada en enero del 2023, se establecieron una serie de compromisos con la comunidad a ser realizados antes de la realización de la tercera campaña en terreno, los cuales corresponden a los siguientes:

- Desarrollo de propuestas de terminaciones del proyecto y elaboración de respuestas pendientes.
- Envío de propuesta de mensaje comunicacional a los inscritos en las mesas de trabajo, para convocar a la comunidad a participar de la tercera campaña PACA.
- Coordinación con Delegado Municipal de Puerto Guadal, para informar de la tercera campaña de actividades y reservar el lugar donde se realizarán las reuniones.
- Ejecución de convocatoria a través de distintos medios: radio, email, llamadas telefónicas, WhatsApp y entrega de invitaciones presenciales.
